



euskal trenbide sarea

EUSKO JAURLARITZA

MUGIKORTASUN
JASANGARRIAREN SAILA




GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE

EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN (BERGARA-LEZO)

Obren hiruhileko txostena




Bilbon, 2026ko irailaren 30ean

Europar Batasuneko << Europa Konektatu >>
Mekanismoak Kofinantzatua




Cofinanciado por el Mecanismo
«Conectar Europa» de la Unión Europea



AURKIBIDEA


- **Gipuzkoako korridorea**
- **Lizitazioak eta esleipenak**
- **Aurrekontuaren egoera**
- **Obren egoera**



- **Gipuzkoako korridorea**


Gipuzkoako korridorea


EGUNGO EGOERA (ETSB)

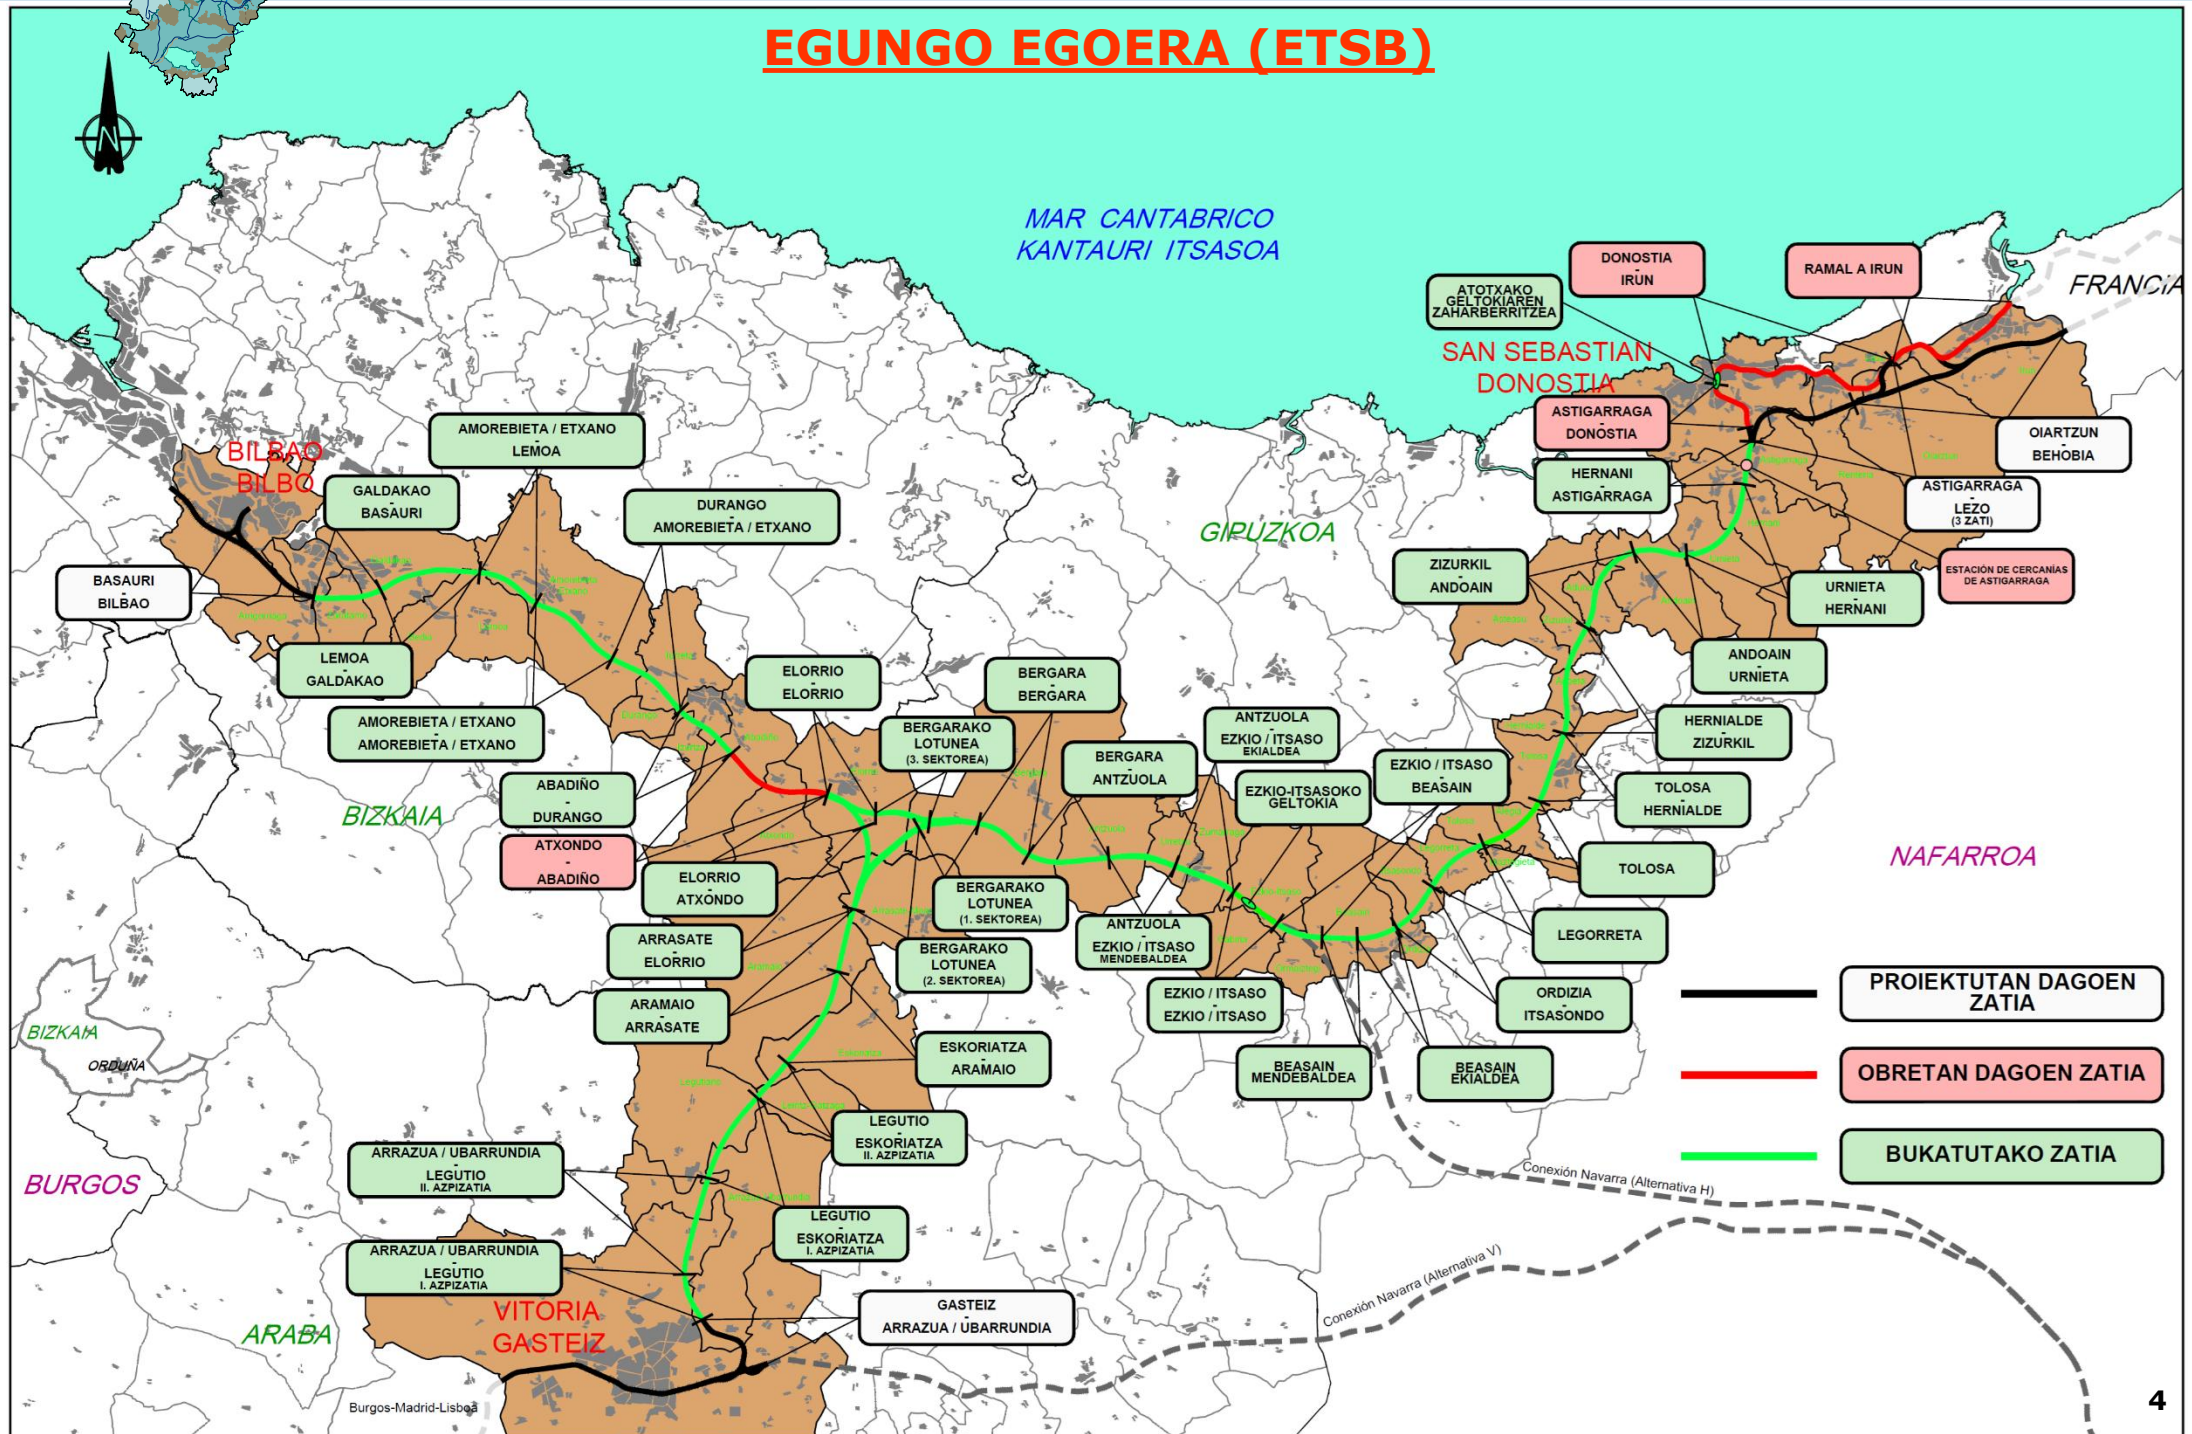


Gipuzkoako korridorea

EGUNGO EGOERA (BERGARA-LEZO ADARRA)

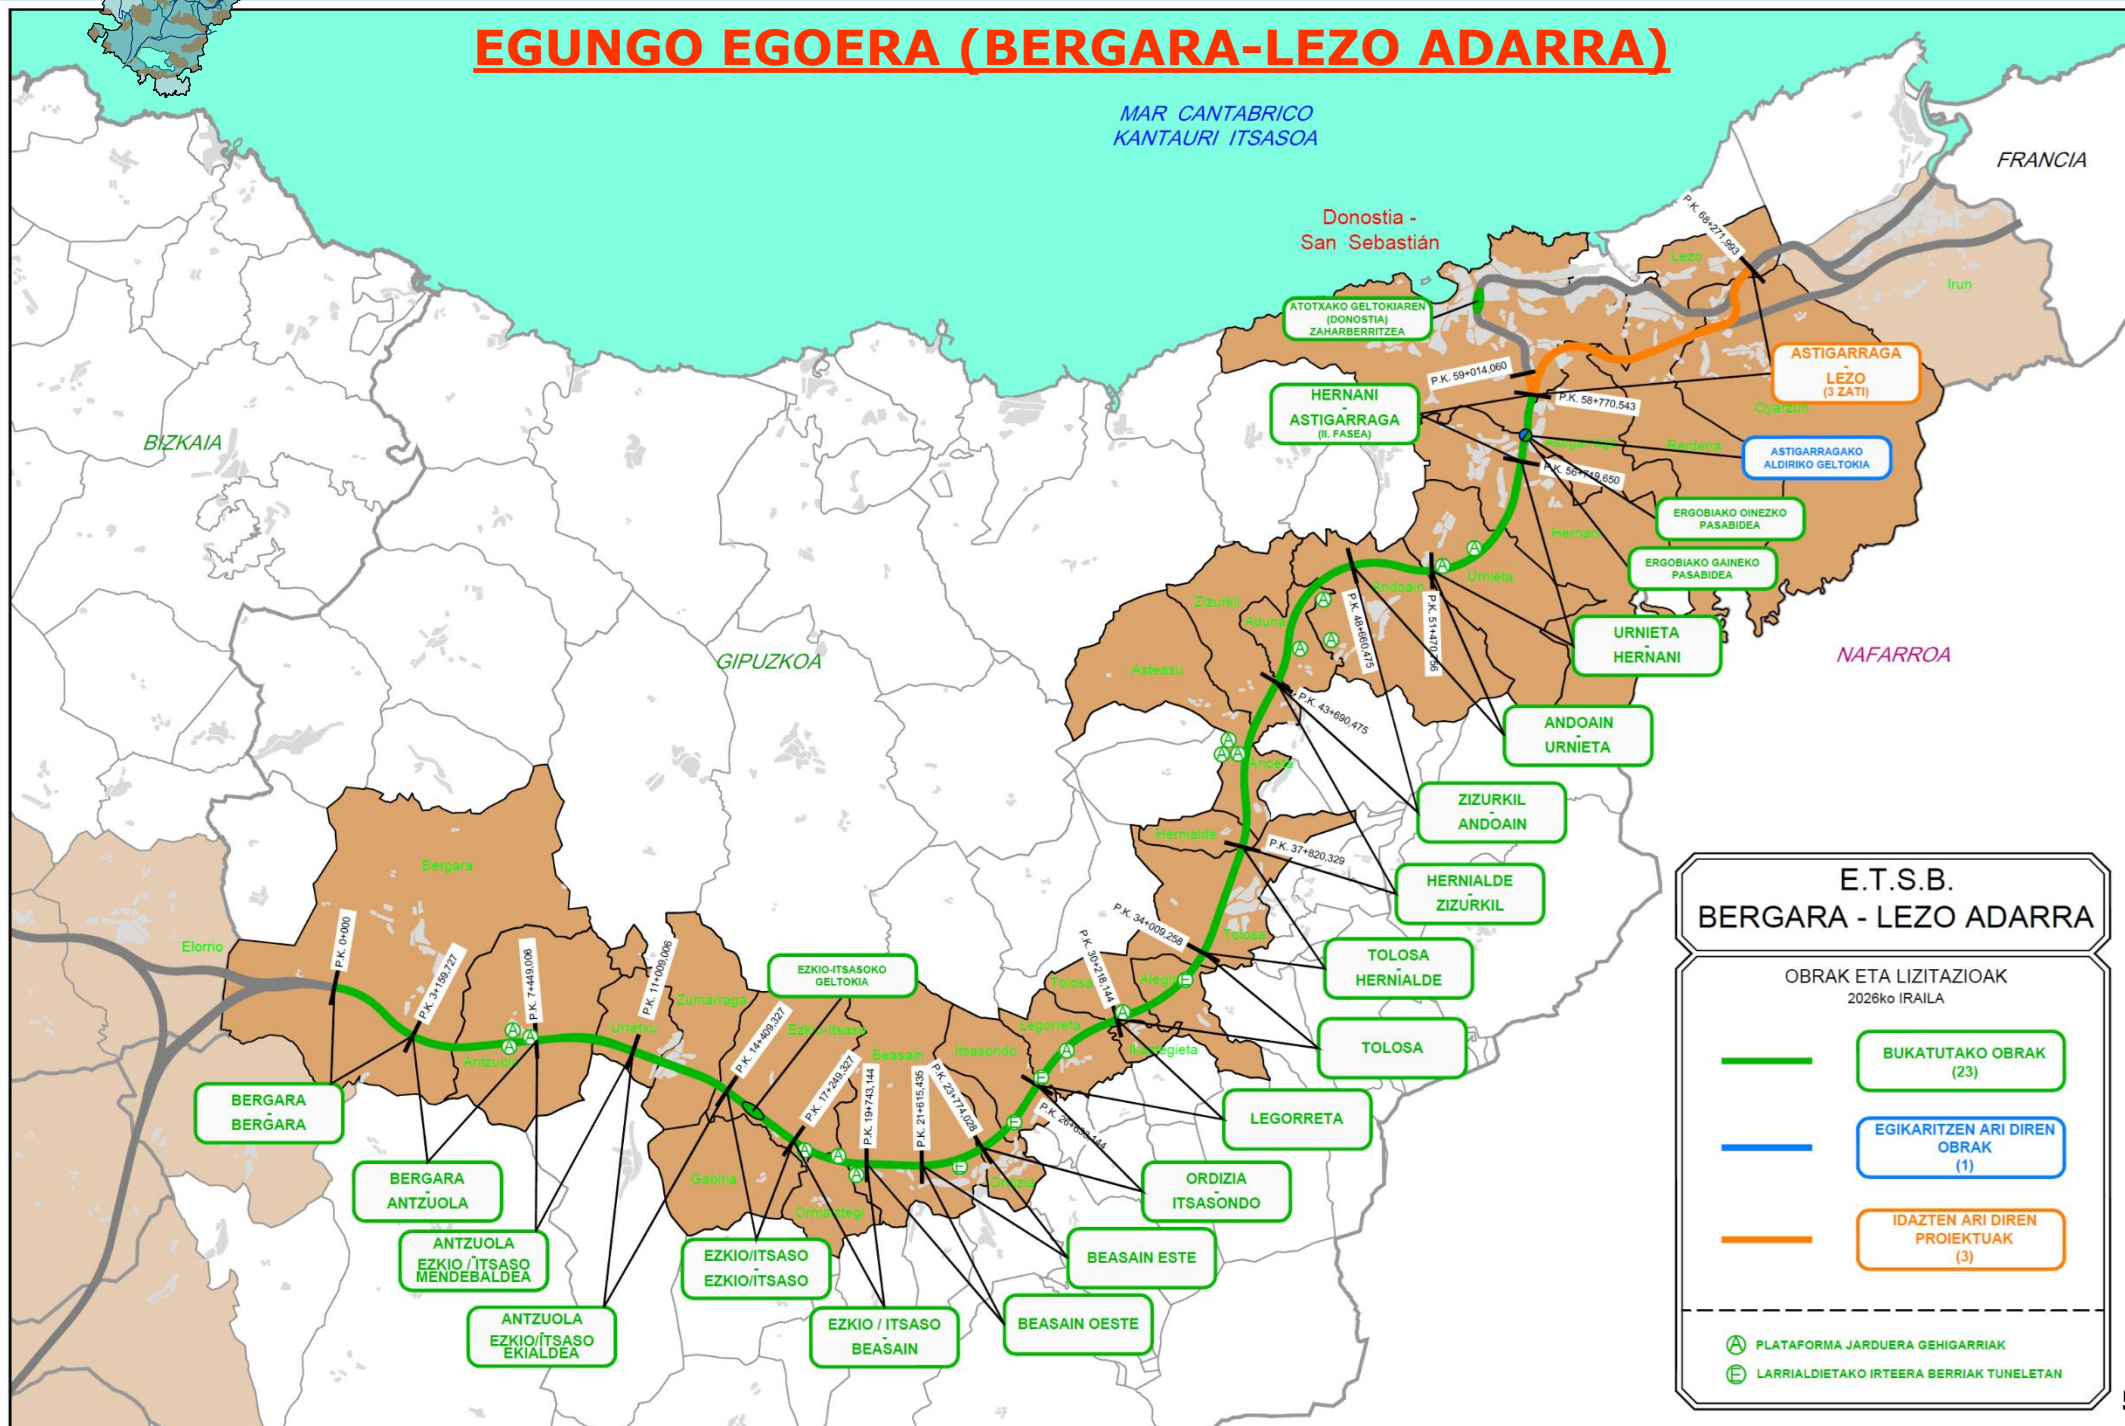



- **Lizitazioak eta esleipenak**




Lizitazioak eta esleipenak

EUSKO JAURLARITZAREN LIZITAZIOAK

EUSKADIKO TSB PLATAFORMAKO OBRAK ZATIAK	Luzera (Km)	ESLEIPENA								
		Lizitazioaren zenbatekoa (€)	Epea (hilabeteak)		Iragarkia (EBAO)	Iragarkia (BOE)	Iragarkia (EHAA)	Eskaintza aurkezteko epemuga	Eskaintza teknikoa zabaltzea	Eskaintza ekonomikoa zabaltzea
BERGARA – BERGARA ²	3,16	100.654.321,96	34,00		22/10/2010	01/11/2010	09/11/2010	09/12/2010	28/12/2011	20/01/2011
BERGARA - ANTZUOLA ¹	4,29	125.071.308,84	36,50		03/12/2009	16/12/2009	21/12/2009	11/01/2010	10/02/2010	10/02/2010
ANTZUOLA – EZKIO / ITSASO MENDEBALDEA ²	3,56	128.903.929,42	65,00		31/08/2010	04/09/2010	03/09/2010	30/09/2010	29/10/2010	12/11/2010
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO EKIALDEA ²	3,40	133.049.806,91	63,00		23/10/2010	30/10/2010	09/11/2010	09/12/2010	28/12/2010	20/01/2011
EZKIO / ITSASO - EZKIO / ITSASO ²	2,84	58.957.283,33	30,00		06/09/2011	10/09/2011	20/09/2011	18/10/2011	03/11/2011	18/11/2011
EZKIO / ITSASO - BEASAIN ²	2,49	61.446.909,62	32,00		03/06/2010	08/06/2010	11/06/2010	08/07/2010	19/07/2010	20/08/2010
BEASAIN MENDEBALDEA ¹	1,87	44.453.669,88	32,00		17/06/2009	26/06/2009	01/07/2009	23/07/2009	21/08/2009	21/08/2009
BEASAIN EKIALDEA ¹	2,16	47.339.419,94	35,00		05/02/2009	10/02/2009	09/02/2009	12/03/2009	20/04/2009	20/04/2009
ORDIZIA - ITSASONDO ¹	2,86	60.290.003,53	31,00		17/08/2007	08/09/2007	11/09/2007	08/10/2007	18/10/2007	18/10/2007
LEGORRETA ¹	3,59	78.071.032,69	36,00		13/05/2009	28/04/2009	05/05/2009	22/06/2009	21/07/2009	21/07/2009
TOLOSA ¹	3,79	84.966.939,90	36,00		16/06/2009	23/06/2009	01/07/2009	23/07/2009	20/08/2009	20/08/2009
TOLOSA - HERNIALDE ²	3,81	112.479.065,22	31,00		23/07/2010	31/07/2010	12/08/2010	08/09/2010	20/09/2010	20/10/2010
HERNIALDE - ZIZURKIL ²	5,87	169.011.341,70	42,00		24/01/2012	23/01/2012	02/02/2012	29/02/2012	12/03/2012	17/04/2012
ZIZURKIL - ANDOAIN ²	4,97	193.575.606,18	46,00		03/09/2011	08/09/2011	20/09/2011	18/10/2011	02/11/2011	30/11/2011
ANDOAIN - URNIETA ²	2,81	80.074.757,78	34,00		31/08/2010	04/09/2010	03/09/2010	30/09/2010	22/10/2010	05/11/2010
URNIETA - HERNANI ²	5,25	144.972.210,28	35,00		31/08/2010	04/09/2010	03/09/2010	30/09/2010	20/10/2010	05/11/2010
HERNANI - ASTIGARRAGA ²	2,48	76.495.366,09	28,00		06/09/2011	08/09/2011	20/09/2011	19/10/2011	03/11/2011	18/11/2011
HERNANI - ASTIGARRAGA. II. FASEA		57.382.263,58	41,00		03/04/2019	-	-	29/04/2019	03/05/2019	03/06/2019
ERGOBIAKO OINEZKO PASABIDEA		523.418,09	13,00		-	-	-	27/11/2018	30/11/2018	05/12/2018
ERGOBIAKO GAIKEKO PASABIDEA		5.833.310,93	11,00		04/12/2018	-	-	03/01/2019	07/01/2019	28/01/2019
ERGOBIAKO GAIKEKO PASABIDEA AMAIERA		2.703.210,75	6,00					09/12/2020	11/12/2020	21/12/2020
PLATAFORMA JARDUERA GEHIGARRIAK	-	1.740.340,06	8,00		-	-	-	23/04/2019	29/04/2019	04/06/2019
LARRIALDIETAKO IRTEERA BERRIAK TUNELETAN	-	16.036.803,62	21,00		13/12/2018	-	-	31/01/2019	04/02/2019	04/03/2019
ATOTXAKO GELTOKIAREN (DONOSTIA) ZAHARBERRITZEA	-	97.062.445,24	42,00		09/12/2019	-	-	20/01/2020	24/01/2020	20/02/2020
EZKIO/ITSASOKO GELTOKIA	-	4.425.104,60	9,00			10/03/2020		29/05/2020	05/06/2020	26/06/2020
ASTIGARRAGAKO ALDIRIKO GELTOKIA ETA BERE SARBIDEAK	-	19.859.822,57	20,00		06/06/2025			07/07/2025	07/07/2025	22/07/2025

¹ Zenbateko horien kasuan, BEZa % 16 da² Zenbateko horien kasuan, BEZa % 18 da
(Gainerakoetan % 21)




Lizitazioak eta esleipenak


EUSKO JAURLARITZAREN ESLEIPENAK

EUSKADIKO TSB PLATAFORMAKO OBRAK ZATIAK	Luzera (Km)	ESLEIPENA							
		Esleipenaren zenbatekoa (€)	Baja	Epea (hilabeteak)	Esleipenaren data	Iragarkia (EBAO)	Iragarkia (BOE)	Iragarkia (EHAA)	Esleipenduna
BERGARA – BERGARA ²	3,16	95.108.268,83	%5,51	34,00	02/03/2011	12/04/2011	02/06/2011	18/07/2011	UTE SACYR - CAMPEZO - CYCASA - FEBIDE
BERGARA - ANTZUOLA ¹	4,29	106.498.219,60	%14,85	35,50	13/04/2010	05/05/2010	-	21/12/2009	UTE FCC - DC -LURGOIEN
ANTZUOLA – EZKIO / ITSASO MENDEBALDEA ²	3,56	119.945.106,32	%6,95	63,00	23/12/2010	30/12/2010	15/01/2011	03/02/2011	UTE ALTUNA Y URÍA S.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.-CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A.
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO EKIALDEA ²	3,40	125.732.067,54	%5,50	63,00	14/03/2011	15/04/2011	16/04/2011	03/05/2011	UTE SOBRINO - OBEGISA GRUPO OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA - GEOTUNEL
EZKIO / ITSASO - EZKIO / ITSASO ²	2,84	56.422.120,08	%4,30	28,00	01/12/2011	29/12/2011	05/01/2012	25/01/2012	UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. - DC CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y GESTIÓN DE OBRA, S.A. - LURGOIEN, S.A. - CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, SAU
EZKIO / ITSASO - BEASAIN ²	2,49	57.418.614,67	%6,56	30,00	15/11/2010	03/12/2010	07/12/2010	29/12/2010	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS - CONSTRUCCIONES MURIAS - EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ
BEASAIN MENDEBALDEA ¹	1,87	43.342.328,13	%2,50	25,00	03/11/2009	17/11/2009	27/11/2009	21/01/2010	UTE MOYUA-BALZOLA-AZVI
BEASAIN EKIALDEA ¹	2,16	44.584.265,71	%5,82	32,00	28/07/2009	05/08/2009	10/08/2009	10/09/2009	UTE DRAGADOS S.A.-IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.A.-OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A.-CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A.U.
ORDIZIA - ITSASONDO ¹	2,86	50.462.733,00	%16,30	27,00	04/12/2007	07/12/2007	28/02/2008	07/03/2008	UTE FCC CONTR.S.A.-CONSTR.OLABARRI,S.L.-GUIHOR ESTRUCTURAS DE HORMIGON,S.L.-CONSTRUC.DONOSTI,S.A.
LEGORRETA ¹	3,59	68.944.528,40	%11,69	30,00	20/10/2009	29/10/2009	09/11/2009	17/11/2009	UTE ACCIONA - VDA. DE SAINZ
TOLOSA ¹	3,79	80.506.175,57	%5,25	28,00	13/10/2009	21/10/2009	08/06/2010	18/08/2010	UTE DRAGADOS - OBRAS SUBTERRÁNEAS - C.C. LEZA
TOLOSA - HERNIALDE ²	3,81	104.729.257,63	%6,89	26,00	29/11/2010	03/12/2010	07/12/2010	21/12/2010	UTE CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN S.A.-GEOTUNEL S.L.
HERNIALDE - ZIZURKIL ²	5,87	158.042.505,62	%6,49	42,00	20/06/2012	13/09/2012	11/02/2013	03/04/2013	UTE ALTUNA Y URÍA, S.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.
ZIZURKIL - ANDOAIN ²	4,97	180.025.313,75	%7,00	46,00	05/03/2012	27/04/2012	08/09/2011	24/05/2012	UTE DRAGADOS, SA - CONSTRUCCIONES AMENABAR, SA - COMSA, SA - CONSTRUCCIONES CIVILES LEZA, SA - ISOLUX CORSÁN-CORVIAM
ANDOAIN - URNIETA ²	2,81	75.670.646,10	%5,50	34,00	24/12/2010	14/01/2011	21/01/2011	07/02/2011	UTE FERROVIAL AGROMAN S.A.-CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.
URNIETA - HERNANI ²	5,25	136.346.363,77	%5,95	33,00	22/12/2010	21/01/2011	27/01/2011	11/02/2011	UTE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CONSTRUCCIONES CIVILES LEZA S.A.-COMSA SAU-OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A.
HERNANI - ASTIGARRAGA ²	2,48	71.523.167,30	%6,50	27,00	02/12/2011	29/12/2011	06/01/2012	24/01/2012	UTE CONSTRUCCIONES MOYUA SL - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SA AZVI SA
HERNANI - ASTIGARRAGA. II. FASEA		46.387.870,09	19,16%	37,00	18/07/2019	15/01/2020			U.T.E. SACYR INF-SACYR NEOPUL-MARIEZCURRENA-ZUBIEDER
ERGOBIAKO OINEZKO PASABIDEA		481.544,64	%8,00	13,00	10/01/2019	-	-	-	CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.
ERGOBIAKO GAIKEKO PASABIDEA		5.480.987,00	%6,04	11,00	21/02/2019	-	-	-	CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A.
ERGOBIAKO GAIKEKO PASABIDEA AMAIERA		2.486.413,25	8,02%	6,00	14/01/2021				SACYR CONSTRUCCIÓN SA
PLATAFORMA JARDUERA GEHIGARRIAK	-	1.731.337,12	%0,52	7,50	05/07/2019	-	-	-	UTE CONSTRUCCIONES OLABARRI SL - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA
LARRIALDIETAKO IRTEERA BERRIAK TUNELETAN	-	12.795.757,21	20,21%	20,00	06/06/2019				UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - OBRAS SUBTERRANEAS SA - CONSTRUCCIONES OLABARRI SL
ATOTXAKO GELTOKIAREN (DONOSTIA) ZAHARBERRITZEA	-	80.416.235,87	17,15%	42,00	02/04/2020				UTE CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. / COMSA, S.A.U. / CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
EZKIO/ITSASOKO GELTOKIA	-	3.931.404,48	11,16%	9,00	04/03/2021				IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.
ASTIGARRAGAKO ALDIRIKO GELTOKIA ETA BERE SARBIDEAK	-	15.805.034,87	20,42%	9,00	04/09/2025				SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. - ALTUNA Y URÍA, S.A. - CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA, S.L. - CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.

¹ Zenbateko horien kasuan, BEZa % 16 da² Zenbateko horien kasuan, BEZa % 18 da (Gainerakoetan % 21)



- **Aurrekontuaren egoera**



Aurrekontuaren egoera

EGUNGO EGOERA

					INDARREKO DATUAK							
ZATIA	Luzera (Km)	Lizitazioaren Oinarritzko Aurrekontua (MC)	Esleipenaren Aurrekontua (MC)	Baja (%)	Indarreko epea (hilabeteak)	Aldatuta, behin betiko onartua (MC)	Osagarria, behin betiko onartua (MC)	Zerga Berregoitzapenak (MC)	Prezioak berraztertzea (C)	Larrialdiko obrak (MC)	Azken neurketa [Likidazioa] (MC)	Indarreko Aurrekontu Likidoa (MC)
Bergara – Bergara	3,16	100,65	95,11	5,51	60,00	4,96 (A1)		1,98	3,59 (B1+B2+B3+L)		-1,45	104,19
Bergara - Antzuola	4,29	125,07	106,50	14,85	71,00	10,98 (A1+A2)		3,01 (B1+B2)	11,75 (B1+B2+B3+B4+L)	4,94 (LO)	-0,43	136,74
Antzuola – Ezkio / Itsaso Mendebaldea	3,56	128,90	119,95	6,95	97,00	23,77 (A1)		2,04	5,06 (B1+B2+L)		10,41	161,23
Antzuola - Ezkio / Itsaso Ekialdea	3,40	133,05	125,73	5,50	76,00	11,28 (A1+A2)		2,79	-3,11 (B1+B2+L)	1,99 (LO)	3,85	142,52
Ezkio / Itsaso - Ezkio / Itsaso	2,84	58,96	56,42	4,30	57,00	1,73 (A1)		1,31	-2,11 (L)	3,74 (LO)	3,45	64,54
Ezkio/Itsasoko Geltokia		4,43	3,93	11,16	17,00				0,35 (BB+BBL)		-2,06	2,22
Ezkio / Itsaso - Beasain	2,49	61,45	57,42	6,56	35,00	5,62 (A1)		0,44	4,31 (B1+B2+L)		1,84	69,62
Beasain Mendebaldea	1,87	44,45	43,34	2,50	62,00	4,27 (A1+A2)		0,89 (B1+B2)	5,73 (B1+B2+B3+L)		0,82	55,05
Beasain Ekialdea	2,16	47,34	44,58	5,82	32,00	0,00 (A1)		0,64	5,64 (B1+B2+L)		4,33	55,19
Ordizia - Itsasondo	2,86	60,29	50,46	16,30	46,00	5,07 (A1+A2)		0,53	3,15 (B1+B2+L)		4,98	64,20
Legorreta	3,59	78,07	68,94	11,69	60,50	5,97 (A1)	5,47 (O)	1,25	10,25 (B1+B2+B3+L)		-3,63	88,25
Tolosa	3,79	84,97	80,51	5,25	80,50	8,04 (A1+A2)		1,41 (B1+B2)	11,05 (B1+B2+L)		0,11	101,11
Tolosa - Hernialde	3,81	112,48	104,73	6,89	48,00	9,25 (A1+A2)		1,68	6,82 (B1+B2+B3+L)		1,69	124,17
Hernialde - Zizurkil	5,87	169,01	158,04	6,49	82,00	-6,47 (A1)		4,02	-4,12 (L)	3,11 (LO)	0,68	155,25
Zizurkil - Andoain	4,97	193,58	180,03	7,00	85,00	0,72 (A1)		4,34			1,75	186,83
Andoain - Urnieta	2,81	80,07	75,67	5,50	64,00	7,53 (A1)		1,43	3,48 (B1+B2+B3+L)		-0,01	88,11
Urnieta - Hernani	5,25	144,97	136,35	5,95	103,00	-8,57 (A1)		2,98	3,14 (B1+B2+B3+L)		-1,43	132,48
Hernani - Astigarraga	2,48	76,50	71,52	6,50	66,00	6,77 (A1)	4,72 (O)	1,82	-0,48 (L)	1,72 (LO1+LO2)	-50,40	35,68
Hernani - Astigarraga. II. Fasea		57,38	46,39	19,16	60,00	20,71 (A1+A2)			12,61 (B1+B2+B3+B4+BB)			79,71
Ergobiako Oinezko Pasabidea		0,52	0,48	8,00	29,00	0,16 (A1)					0,05	0,69
Ergobiako Gaietako Pasabidea		5,83	5,48	6,04	11,00					0,80 (LO)	0,53 (LO)	6,81
Ergobiako Gaietako Pasabidea Amaiera		2,70	2,49	8,02	6,00						0,19	2,67
Plataforma Jarduera Gehigarriak	-	1,74	1,73	0,52	23,00	0,01 (A1)					0,11	1,85
Atotxako Geltokiaren zaharberritzea (Donostia)	1,54	97,06	80,42	17,15	73,00	15,11 (A1+A2)			18,34 (B1/2/3/4+BB1/2/3/4/5)			113,87
Astigarragako aldiriko geltokia eta haren sarbideak	-	16,55	15,81	4,50	20,00							15,81
Larrialdietako Irteera Berriak Tuneletan	-	16,04	12,80	20,21	31,00	0,17 (A1)			0,30 (BB+L)		0,73	14,00
	60,73	1.902,07	1.744,82	8,27		127,10	10,19	32,56	95,74	16,30	-23,90	2.002,79

A1/A2: Aldatuta 1, 2...

G: Gehigarria

O: Osagarria

B1/B2/BB: Prezioak Berraztertzea 1, 2...

Berezia

L: Likidazioa

LO: Larrialdiko Obrak


Bukatutako Obrak

Ukitutako zerbitzuak: 7,80

Ondareko erreklamazioak: 31,66

GUZTIRA: 2.042,25

Esleipenaren gaineko ehunekoa:	%7,28	%0,58		%0,93	-%1,37
	%7,43				
Lizitazioaren gaineko ehunekoa:	%6,68	%0,54		%0,86	-%1,26
	%6,82				




Aurrekontuaren egoera


EGUNGO EGOERAREN LABURPENA

EGUNGO EGOERA		Esleipenaren %-a	Lizitazioaren %-a
Esleipenak		1.729,01 M€	
Aldatuak, osagarriak eta larrialdiko obrak	153,57 M€	%8,80	%8,07
Obra-likidazioak	-23,90 M€	%-1,37	%-1,26
BEZaren zerga-berregokitzapenak	32,56 M€		
Prezioak berraztertzea	95,74 M€		
GUZTIRA:		257,97 M€	
Guztira, indarreko aurrekontu likidoa		2.002,79 M€	
Ukitutako zerbitzuak	7,80 M€		
Ondarezko erreklamazioak	31,66 M€		
GUZTIRA:		2.042,25 M€	

Aldatuen, osagarrien, larrialdiko obren eta indarreko azken neurketen zenbatekoaren ondorioz esleitutako aurrekontua % 7,43 handitu da, eta obren lizitazio-aurrekontua % 6,82.





- **Obren egoera**



OBREN EGOERA

Bergara - Bergara

Zati hau 2016-06-30ean jaso zen

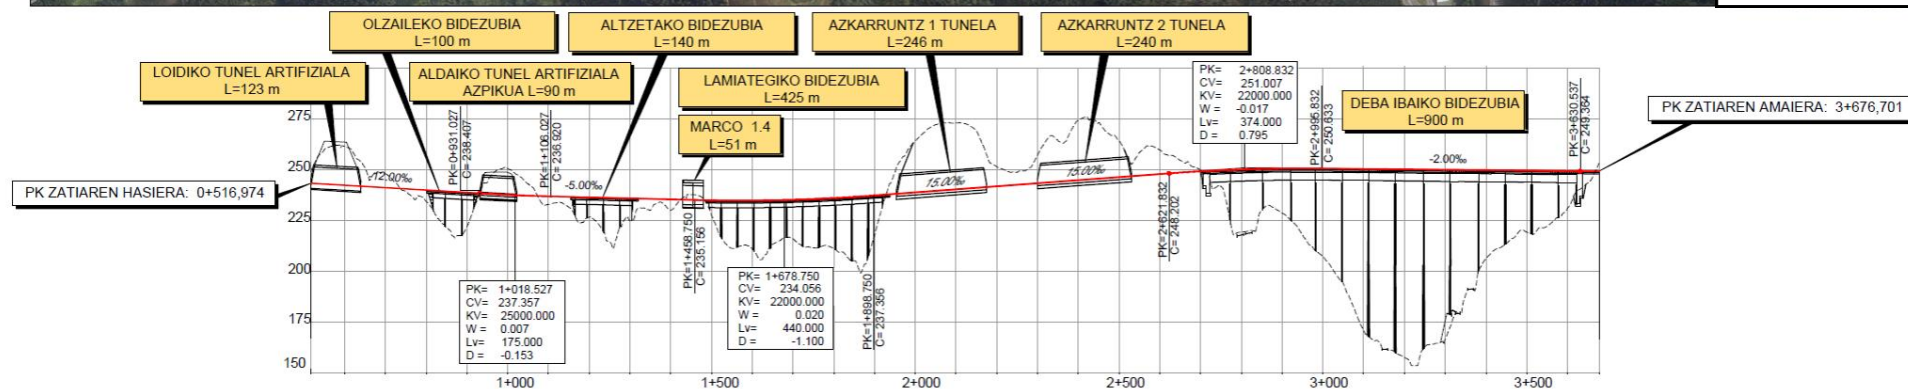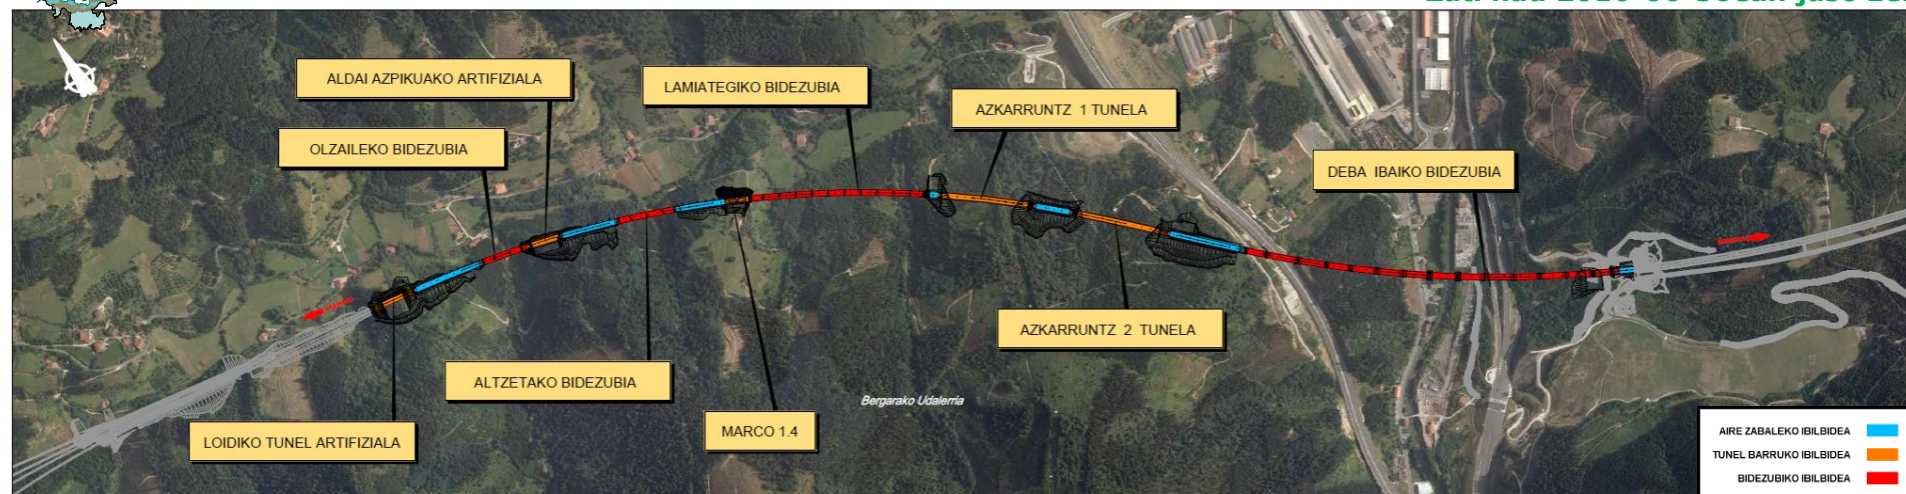**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	100.654.321,96	95.108.268,83	104.192.006,51
Epea (hilab.)	34	34	60

Kop. Luzera Sekzio librea

Bidezubiak	4	1.565,00 m.	
Tunelak	4	699,00 m.	85-100 m ²

Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	14-01-2010
Eraikuntza proiektua:	30-07-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	16-12-2009
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	1-11-2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	28-12-2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	20-01-2011
Esleipena:	2-03-2011

Kontratista: UTE SACYR, CAMPEZO, CYCASA, FEBIDE

Ezaugarri teknikoak



Luzera guztira:	3.159,73 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	2.650 m.
Gehieneko malda:	15,00 %
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Bergara - Antzuola

Zati hau 2016-06-30ean jaso zen

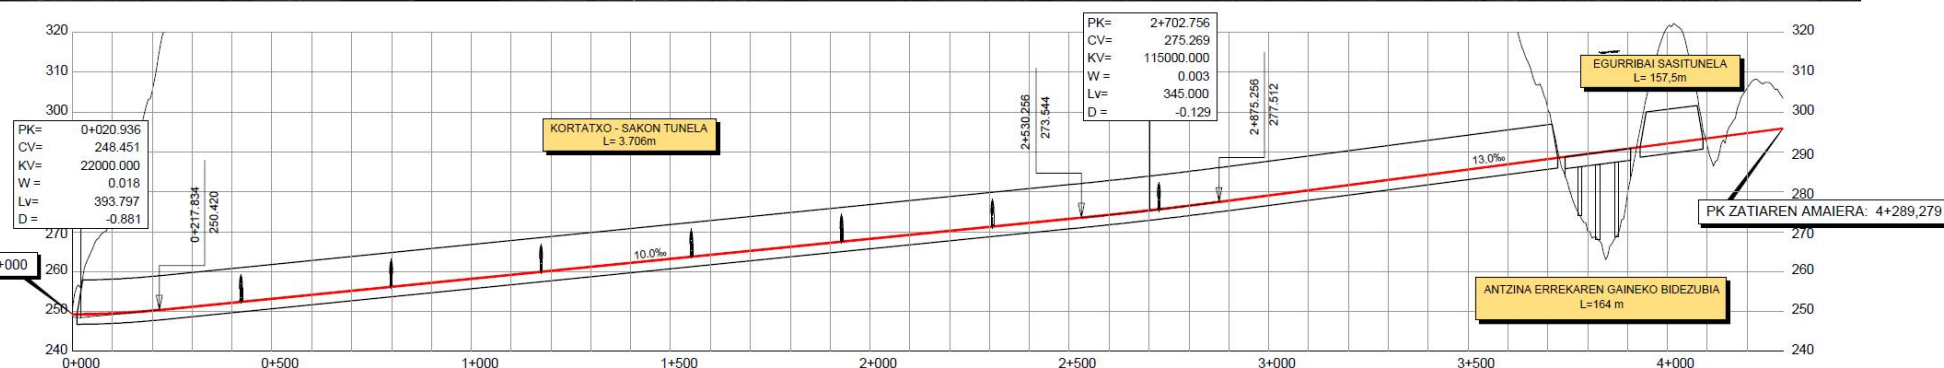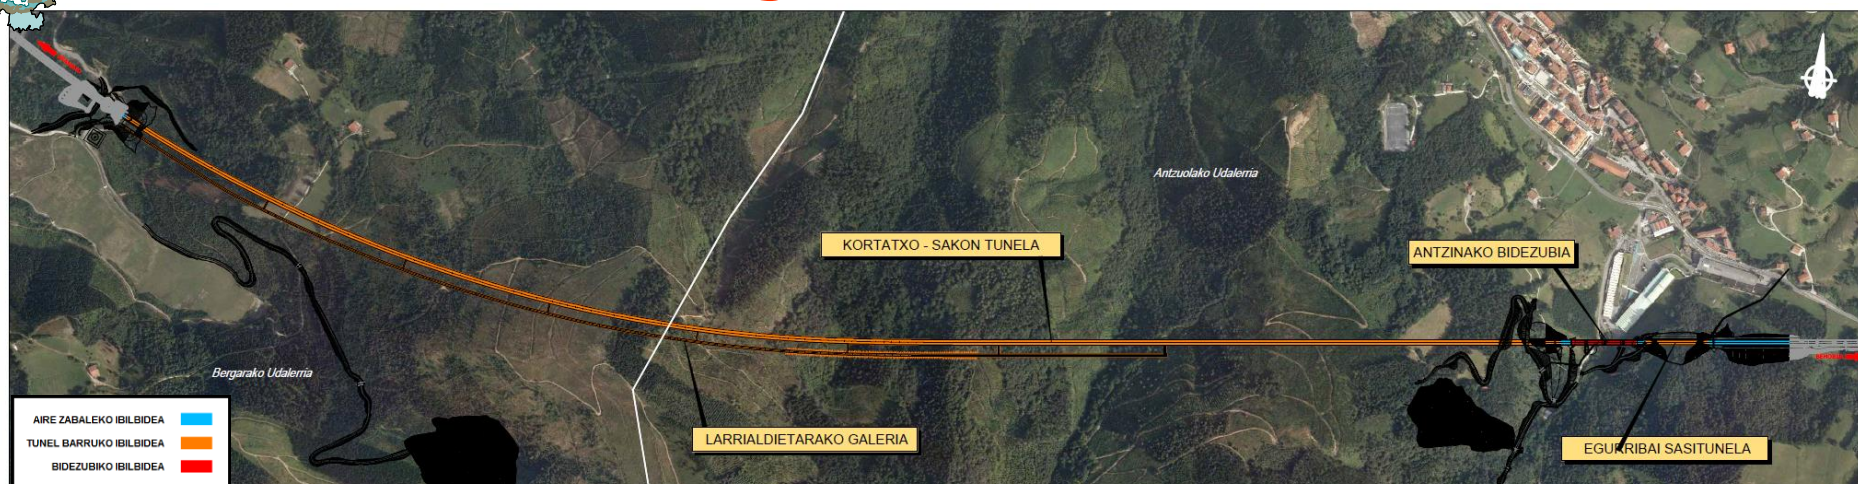**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	125.071.308,84	106.498.219,60	136.738.537,04
Epea (hilab.)	36,5	35,5	71

*Indarreko aurrekontuan larrialdiko obra ere sartzen da

	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	1	164,00 m.	
Tunelak	2	3.863,50 m.	85 - 100 m ²
Ebakuazio-galeriak	1	2.750,40 m.	26 m ²


Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	22-06-2009
Eraikuntza proiektua:	16-07-2009
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	--
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	16-12-2009
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	10-02-2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	10-02-2010
Esleipena:	13-04-2010



Kontratista: UTE FFC CONSTRUCCION, SA-DC CONSTRUCCION-LURGOIEN, SA

Ezaugarri teknikoak

Luzera guztira: 4.289,28 m.
(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa: 3.475 m.
Gehieneko malda: 13,00 %
Gehieneko abiadura: 250 Km/h
Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

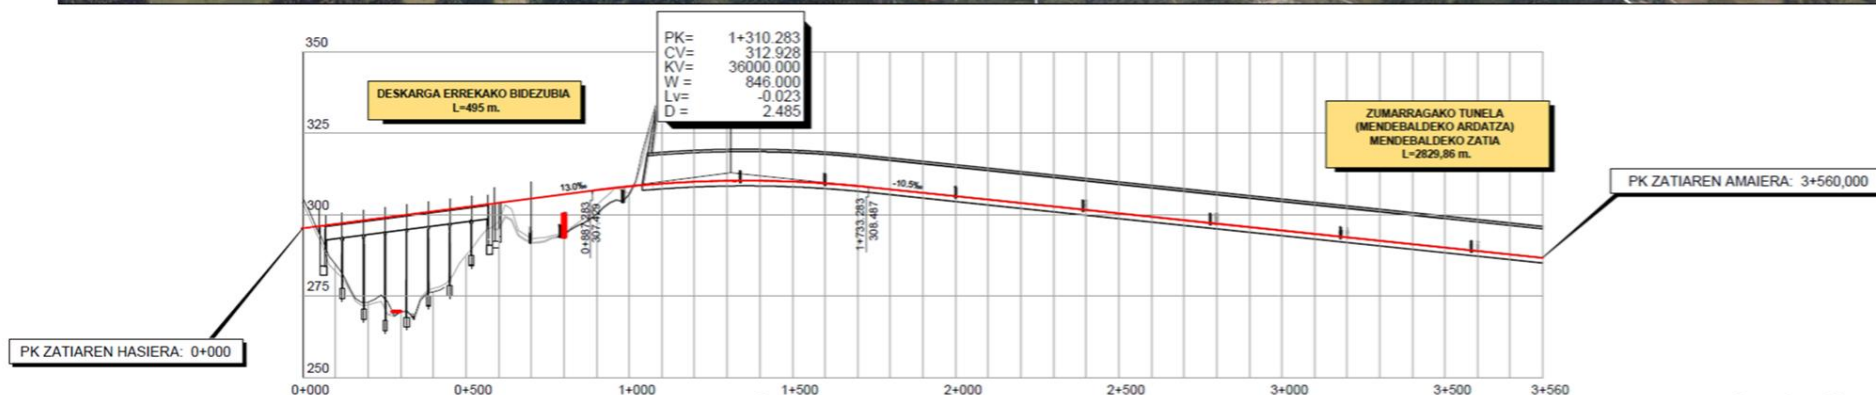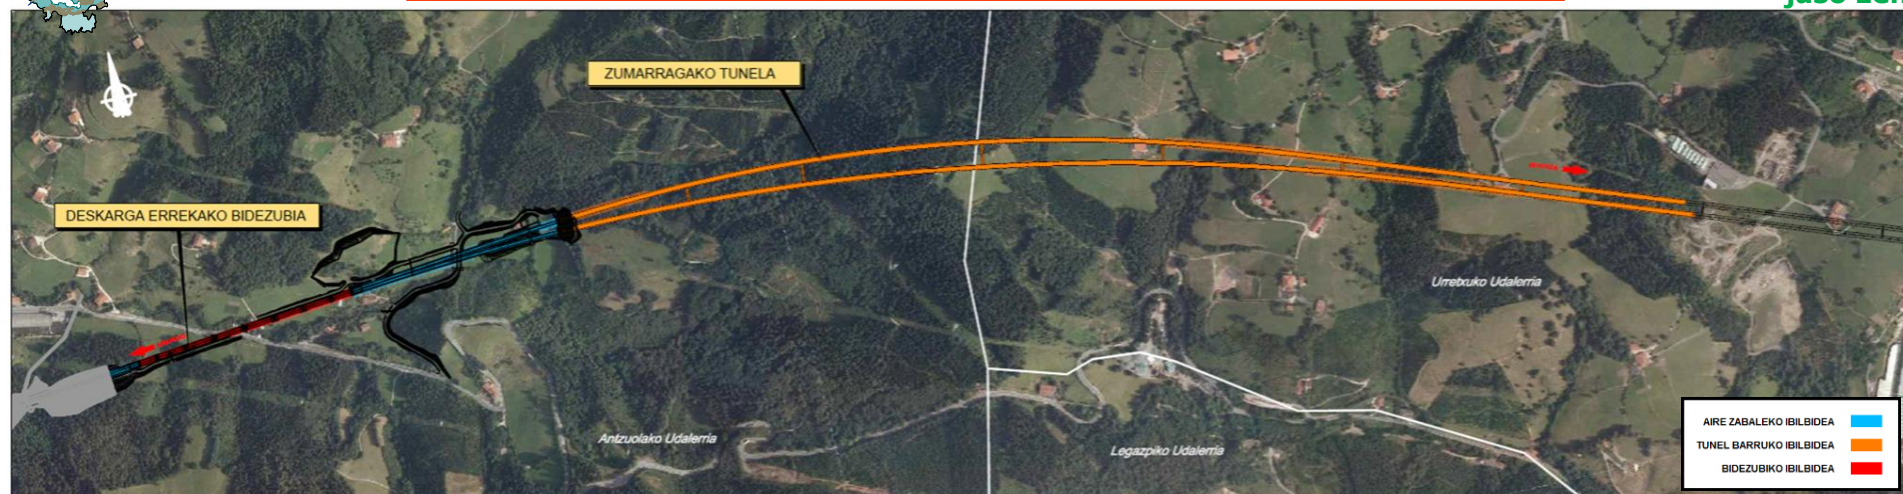Antzuola – Ezkio/Itsaso. MendebaldeaZati hau 2019-09-11n
jaso zen**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	128.903.929,42	119.945.106,32	161.225.322,38
Epea (hilab.)	65	63	97


	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	1	495,00 m. (Trenbide bikoitza)	
Tunelak	1	2.850,86 m. (Bi hodi)	56 m ² y 52 m ²

Proiektuaren egoera


Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	18-01-2010
Eraikuntza proiektua:	24-06-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	19-12-2009
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	04-09-2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	29/10/2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	12/11/2010
Esleipena:	23/12/2010
Kontratista: UTE ALTUNA Y URIA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - CONSTRUCCIONES GALDIANO, SA	

Ezaugarri teknikoak

Luzera guztira:	3.560,00 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	5.150 m.
Gehieneko malda:	13,00 ‰
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

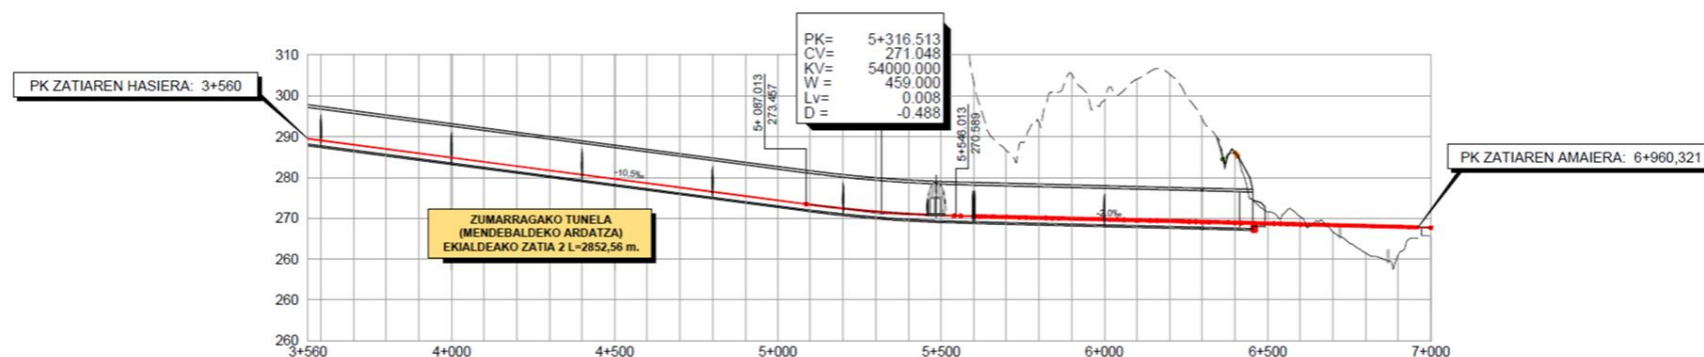Antzuola – Ezkio/Itsaso. EkialdeaZati hau 2017-10-4an
jaso zen**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	133.049.806,91	125.732.067,54	142.521.346,20
Epea (hilab.)	63	63	76

* Indarreko aurrekontuan larrialdiko obra ere sartzen da

	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Tunelak	1	2.520,01 (Bi hodi)	56 m ² y 52 m ²

Proiektuaren egoera



Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	18-01-2010
Eraikuntza proiektua:	30-07-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	19-12-2009
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	30-10-2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	28-12-2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	20-01-2011
Esleipena:	14-03-2011
Kontratista:	UTE SOBRINO, OBEGISA GRUPO OBRAS ESPECIALES, GEOTUNEL

Ezaugarri teknikoak

Luzera guztira:	3.376,876 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	3.940 m.
Gehieneko malda:	10,50 %
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

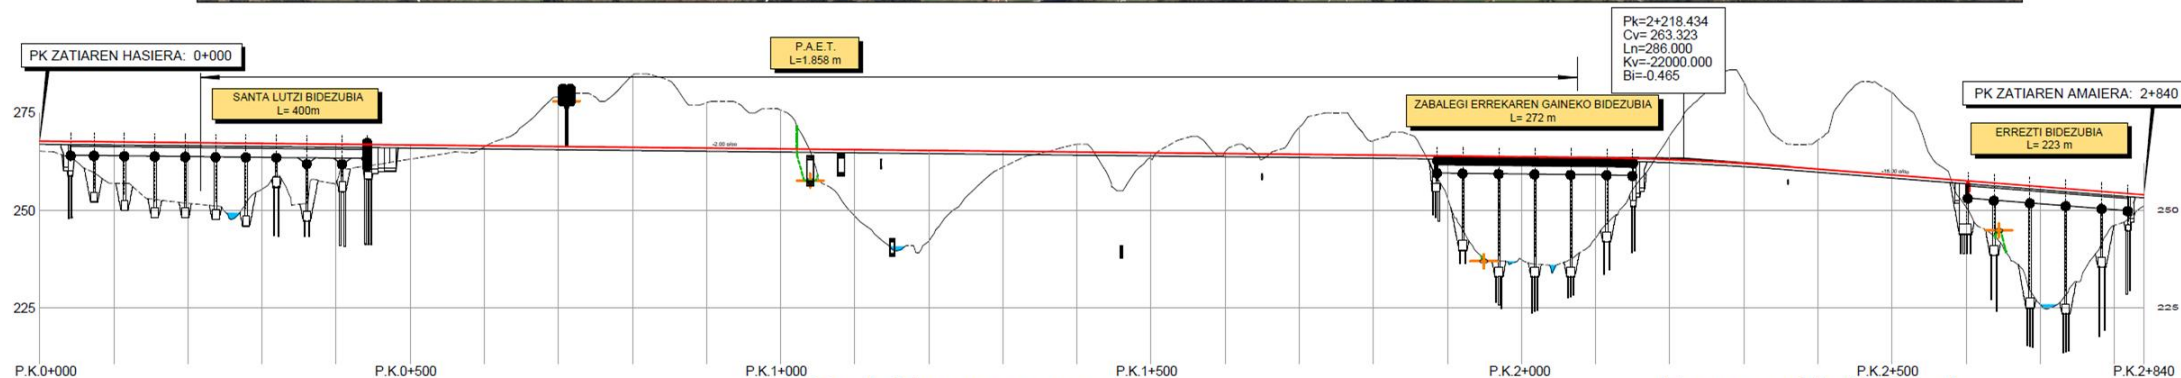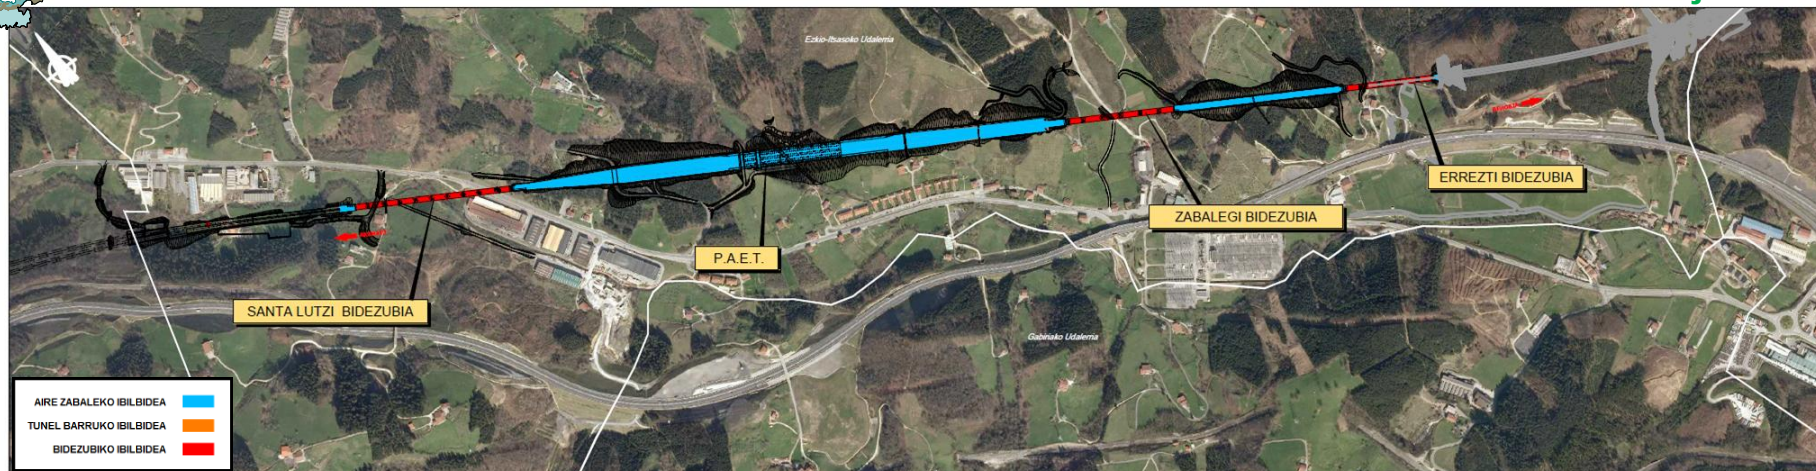Ezkio/Itsaso – Ezkio/ItsasoZati hau 2016-11-17an
jaso zen**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	58.957.283,33	56.422.120,08	64.542.970,62
Epea (hilab.)	30	28	57

* Indarreko aurrekontuan larrialdiko obra ere sartzen da

Kop. Luzera Sekzio librea**Bidezubiak** 3 895,00 m.**Proiektuaren egoera**

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	22-07-2011
Eraikuntza proiektua:	29-07-2011
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	28-07-2011
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	10-09-2011
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	11-11-2011
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	18-11-2011
Esleipena:	01-12-2011

Kontratista: FCC CONSTRUCCION - DC CONSTRUCCION - LURGOIEN -CAMPEZO

Ezaugarri teknikoak

Luzera guztira: 2.840,00 m.
(Trenbide bikoitza)


Gutxieneko erradioa: INFINITUA

Gehieneko malda: 15,00 ‰

Gehieneko abiadura: 250 Km/h

Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)



Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Ezkio / Itsaso - Beasain

Zati hau 2014-02-03an jaso zen

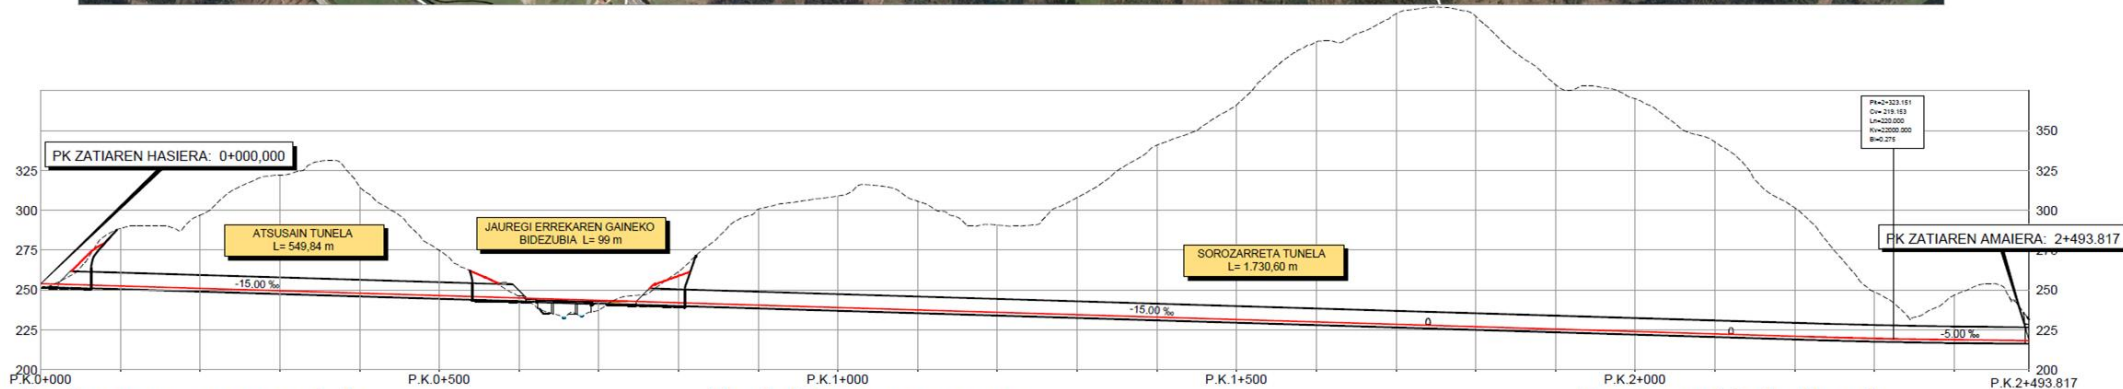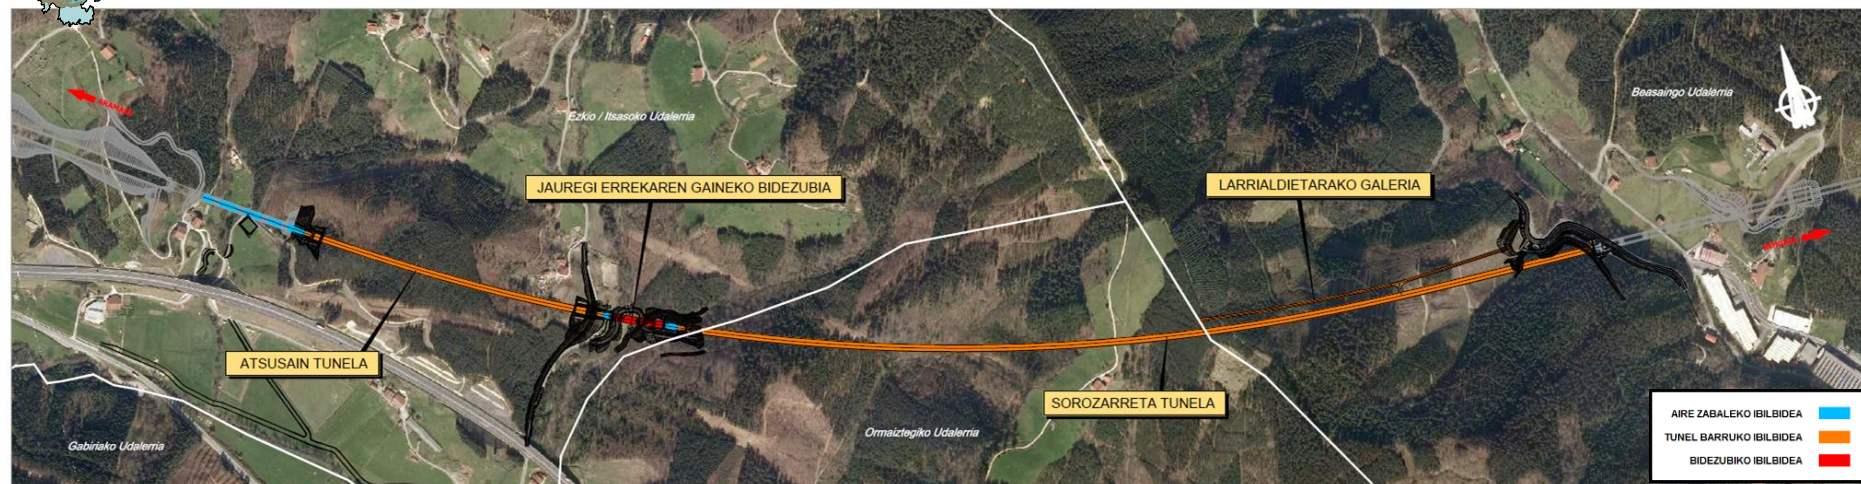**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	61.446.909,62	57.418.614,67	69.622.747,22
Epea (hilab.)	32	30	35

Kop. Luzera Sekzio librea

Bidezubiak	1	99,00 m.	
Tunelak	2	2.280,44 m.	85 m ²
EBakuazio galeriak	1	785,57 m.	--


Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarritzko proiektua:	30-09-2009
Eraikuntza proiektua:	15-04-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	14-01-2010
Lizitazioaren iragarkia BOen:	08-06-2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	19-07-2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	20-08-2010
Esleipena:	15-11-2010

Kontratista: UTE CONSTRUCCIONES ORTIZ, SA - CONSTRUCCIONES MURIAS, SA - EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ

Ezaugarri teknikoak



Luzera guztira:	2.493,82 m.
	(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	3.550 m.
Gehieneko malda:	15,00 %
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Beasain Mendebaldea

Zati hau 2015-04-28an jaso zen

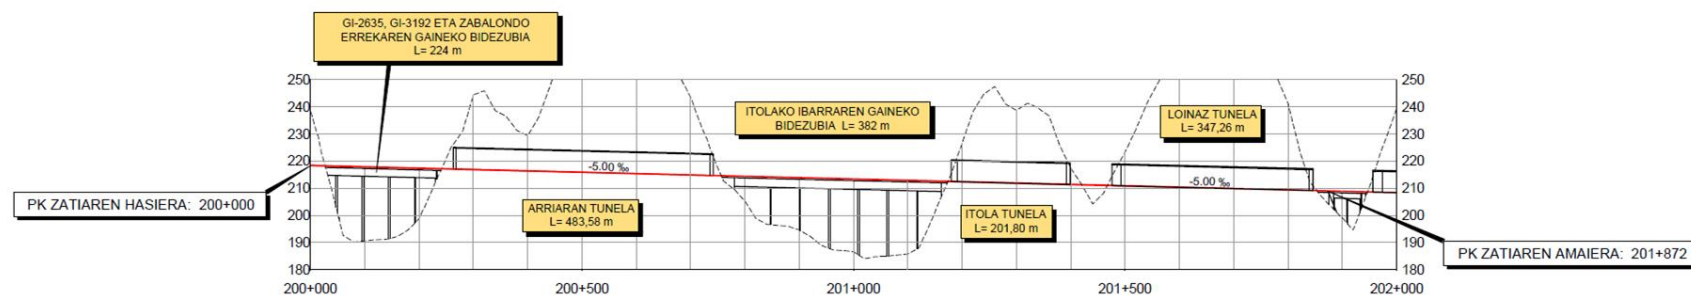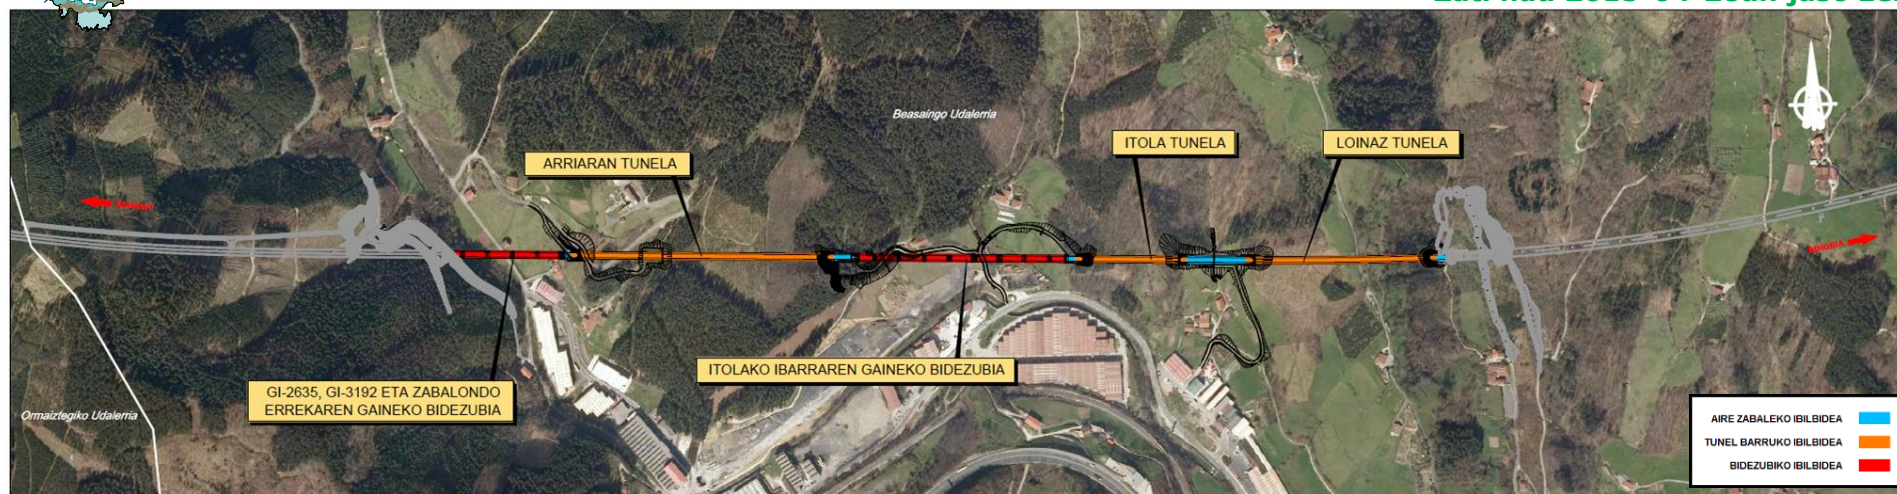**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	44.453.669,88	43.342.328,13	55.047.921,80
Epea (hilab.)	32	25	62

	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	2	606,00 m.	
Tunelak	3	1.068,00 m.	95 m ²

Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarritzko proiektua:	13-07-2007
Eraikuntza proiektua:	23-12-2008
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	08-02-2008
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	26-06-2009
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	21-08-2009
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	21-08-2009
Esleipena:	03-11-2009

Kontratista: UTE CONSTRUCCIONES MOYUA, SL - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, SA - AZVI, SA

Ezaugarri teknikoak



Luzera guztira:	1.872,29 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	4.100 m.
Gehieneko malda:	5,00 ‰
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Beasain Ekialdea

Zati hau 2012-09-25ean jaso zen

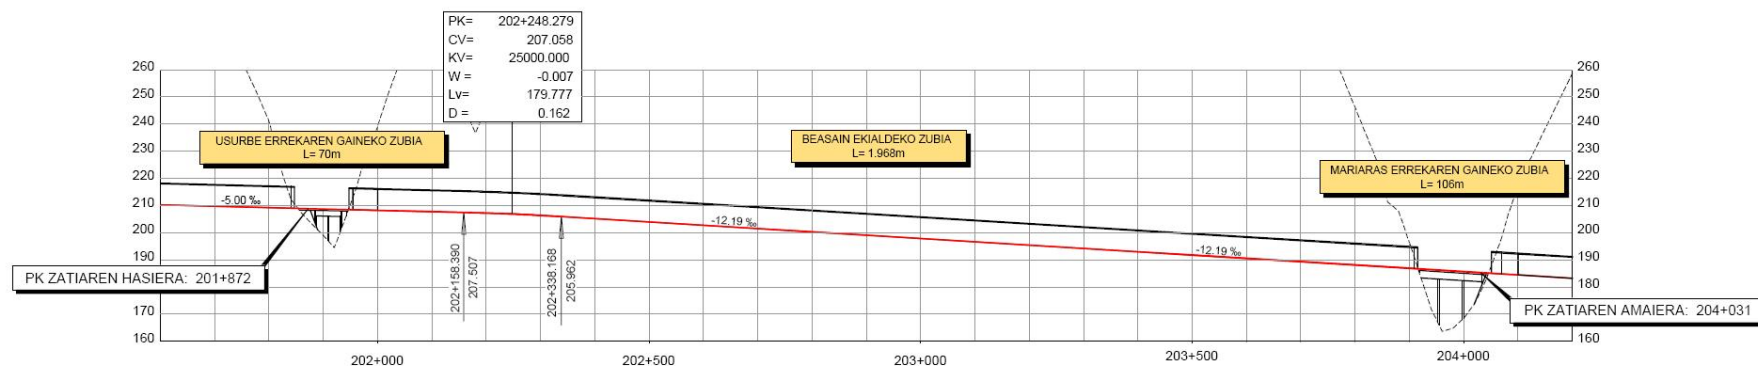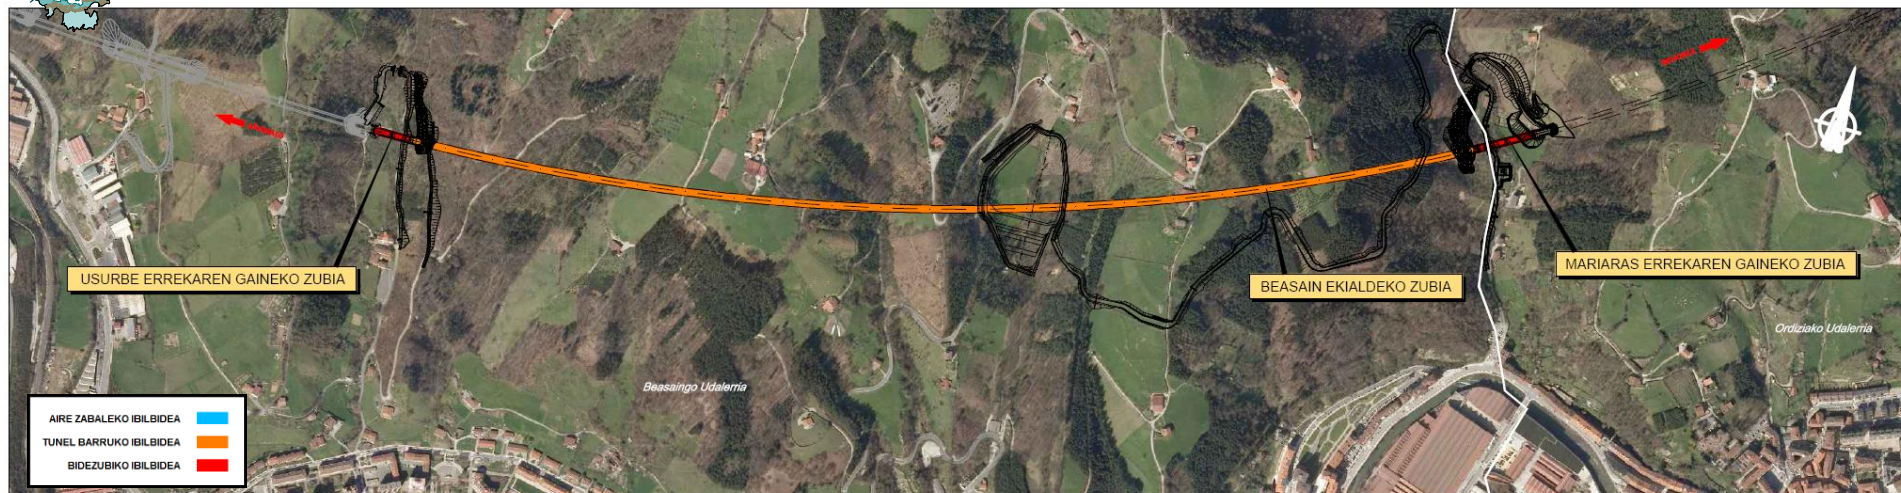**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	47.339.419,94	44.584.265,70	55.193.136,99
Epea (hilab.)	35	32	32

Kop. Luzera Sekzio librea

Bidezubiak	2	176,00 m.	
Tunelak	1	1.968,00 m.	85 m²


Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	13-07-2007
Eraikuntza proiektua:	10-09-2008
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	07-02-2008
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	10-02-2009
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	20-04-2009
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	20-04-2009
Esleipena:	28-07-2009

Kontratista: UTE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, SA - IZA OBRAS Y PROMOCIONES-OBRAS SUBTERRANEAS - CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, SAU

Ezaugarri teknikoak


Luzera guztira:	2.158,59 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	4.100 m.
Gehieneko malda:	12,19 %
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Ordizia - Itsasondo

Zati hau 2012-04-18an jaso zen

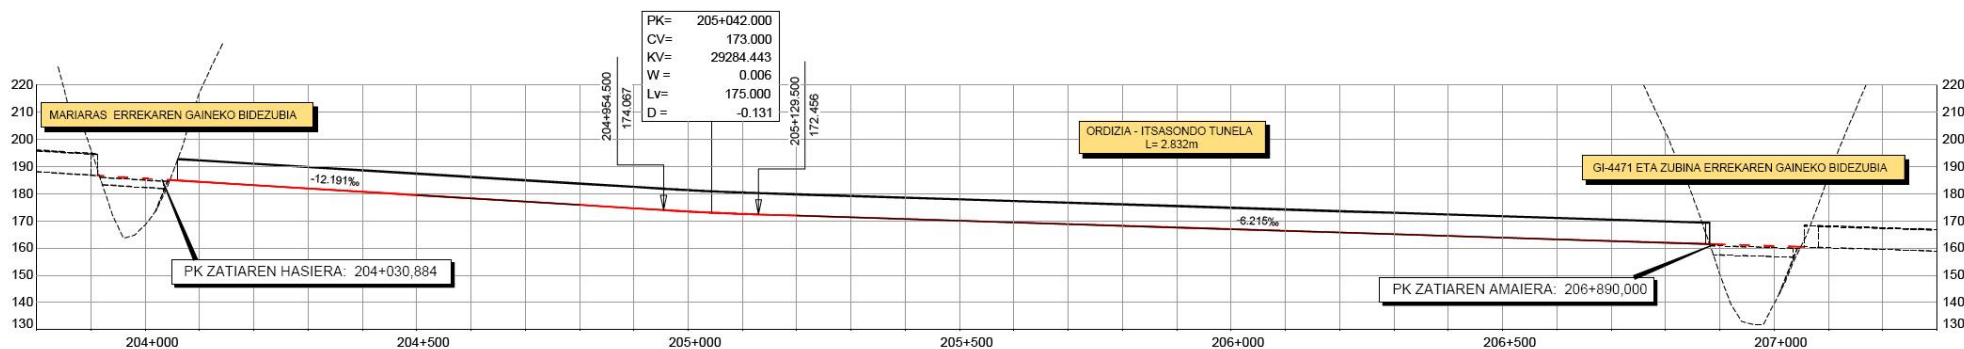**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	60.290.003,53	50.462.733,00	64.200.040,72
Epea (hilab.)	31	27	46

Kop. Luzera Sekzio librea

Bidezubiak	1	2.832,00 m.	85 m²
Tunelak	1	304,00 m.	30 m²


Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	13-07-2007
Eraikuntza proiektua:	20-07-2007
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	24-04-2007
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	08-09-2007
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	18-10-2007
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	18-10-2007
Esleipena:	04-12-2007

Kontratista: UTE FFC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCCIONES OLABARRI, SA -
GUIHOR - CONSTRUCCIONES DONOSTI

Ezaugarri teknikoak


Luzera guztira:	2.859,12 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	4.100 m.
Gehieneko malda:	12,19 ‰
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Legorreta

Zati hau 2015-04-28an jaso zen

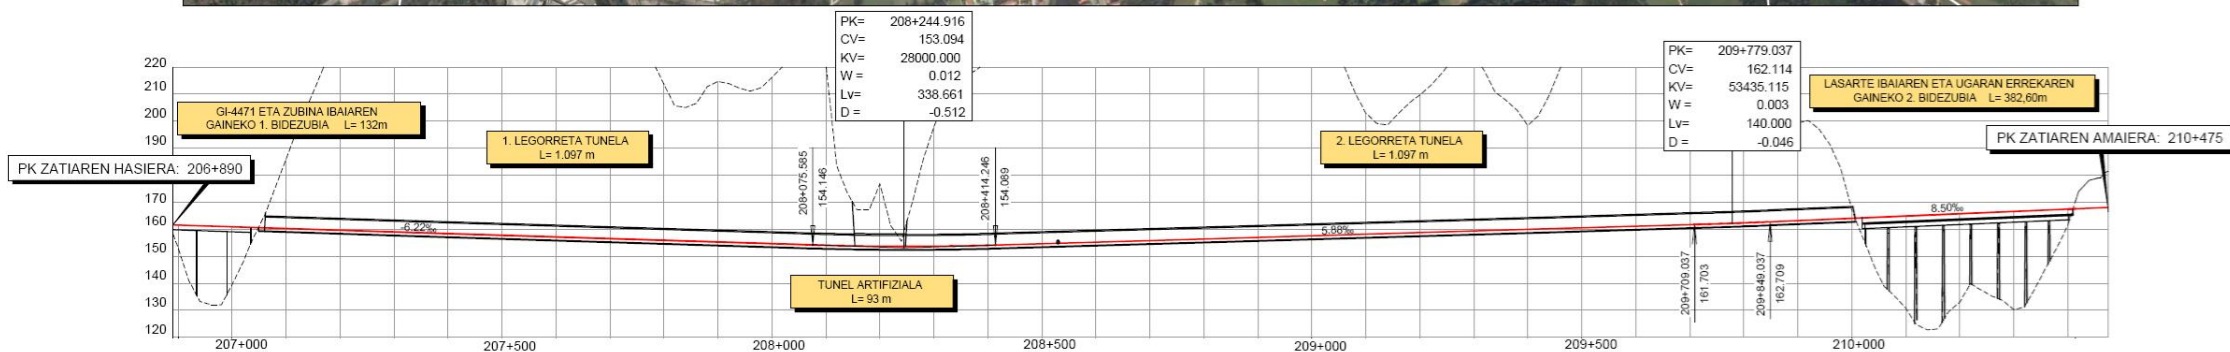**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	78.071.032,69	68.944.528,40	88.245.515,36
Epea (hilab.)	36	30	60,5

* Indarreko aurrekontuan obra osagarria ere sartzen da

	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	2	526,60 m.	
Tunelak	1	2.941,00 m.	85 m ²
Ebakuazio galeriak	1	177,00 m.	30 m ²

Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	19-10-2007
Eraikuntza proiektua:	29-01-2009
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	07-02-2008
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	28-04-2009
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	21-07-2009
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	21-07-2009
Esleipena:	20-10-2009




Kontratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - EXCAVACIONES
VIUDA DE SAINZ, SA**Ezaugarri teknikoak**

Luzera guztira: 3.585,00 m.
(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa: 4.000 m.
Gehieneko malda: 8,50 ‰
Gehieneko abiadura: 250 Km/h
Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)

OBREN EGOERA

Tolosa

Zati hau 2016-11-17an jaso zen

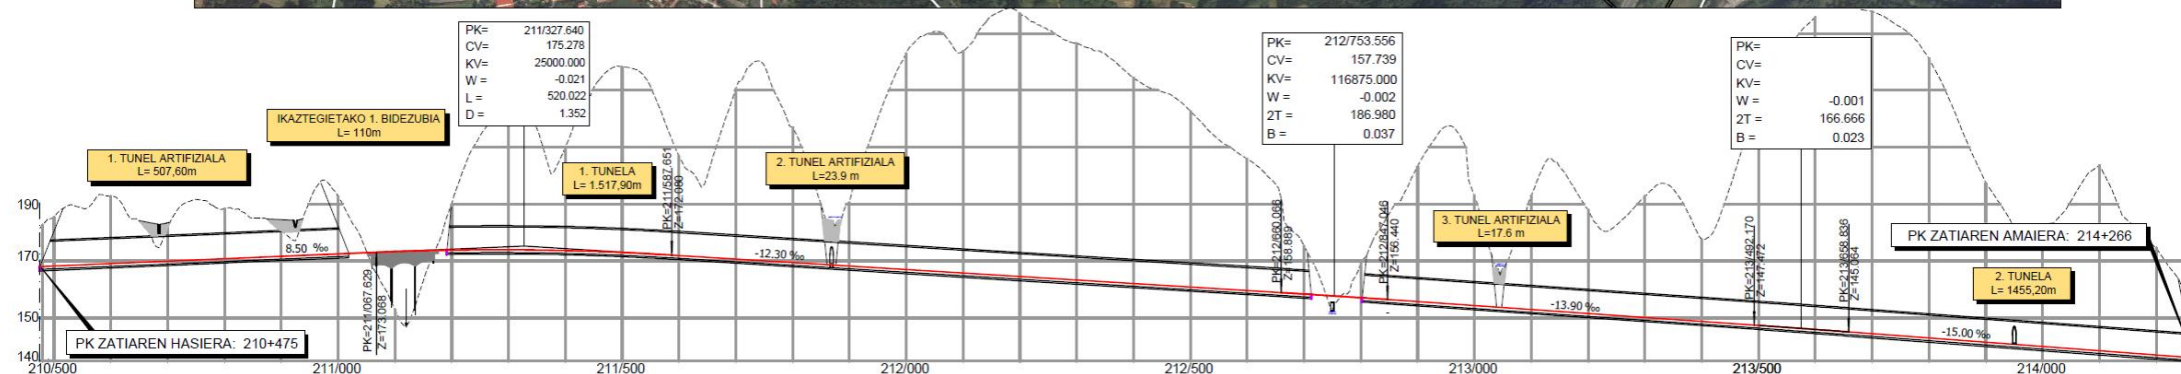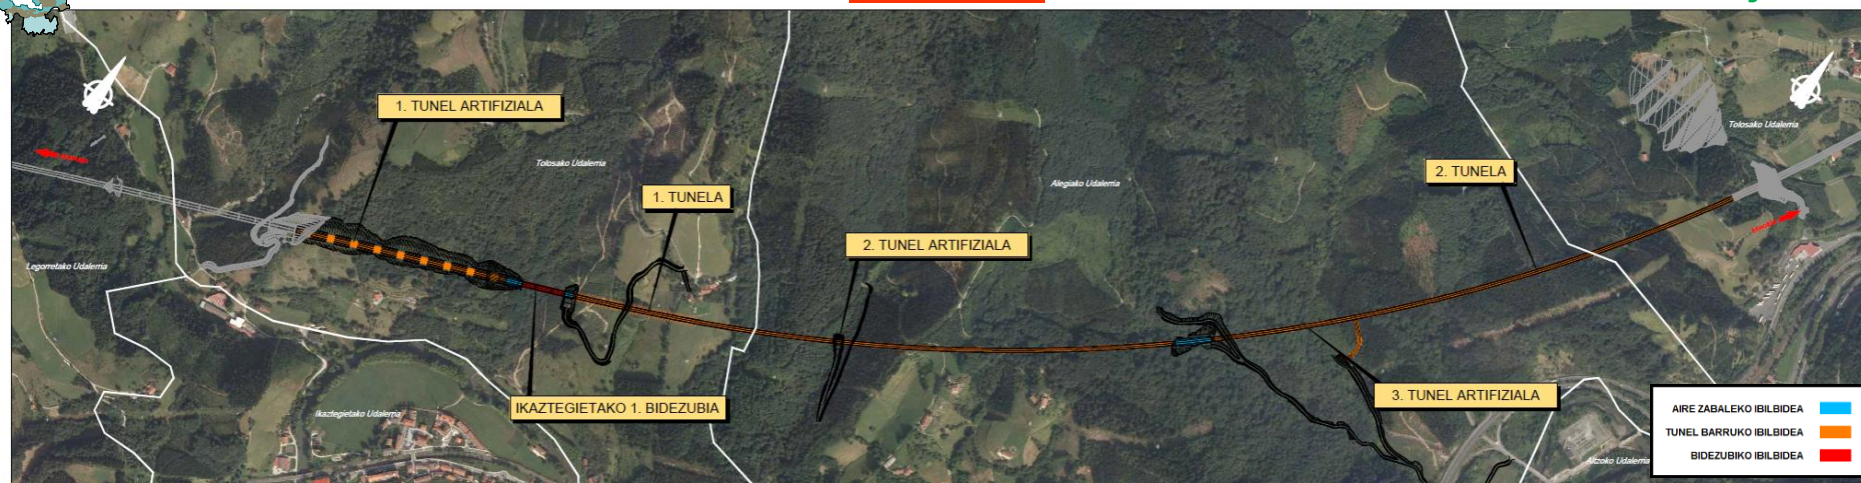

Kontratuaren ezaugarriak

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	84.966.939,90	80.506.175,57	101.105.019,13
Epea (hilab.)	36	28	80,50


	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	1	110,00 m.	
Tunelak	3	3.480,70 m.	85-100 m ²
Ebakuazio galeriak	2	461 m.	30 m ²

Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	19-10-2007
Eraikuntza proiektua:	01-04-2009
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	07-02-2008
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	23-06-2009
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	20-08-2009
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	20-08-2009
Esleipena:	13-10-2009
Kontratista:	UTE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, SA - OBRAS SUBTERRANEAS - CONSTRUCCIONES LEZA, SA

Ezaugarri teknikoak



Luzera guztira:	3.791,11 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	4.450 m.
Gehieneko malda:	15,00 ‰
Gehieneko abiadura:	250 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Tolosa - Hernialde

Zati hau 2015-03-12an jaso zen

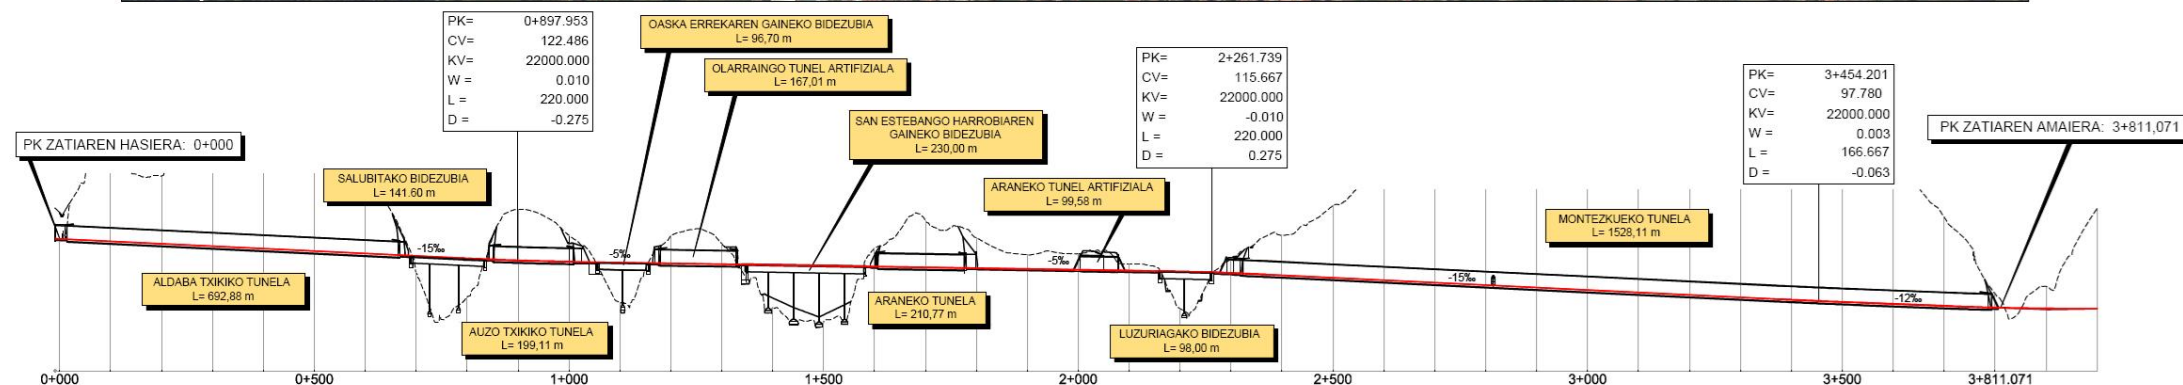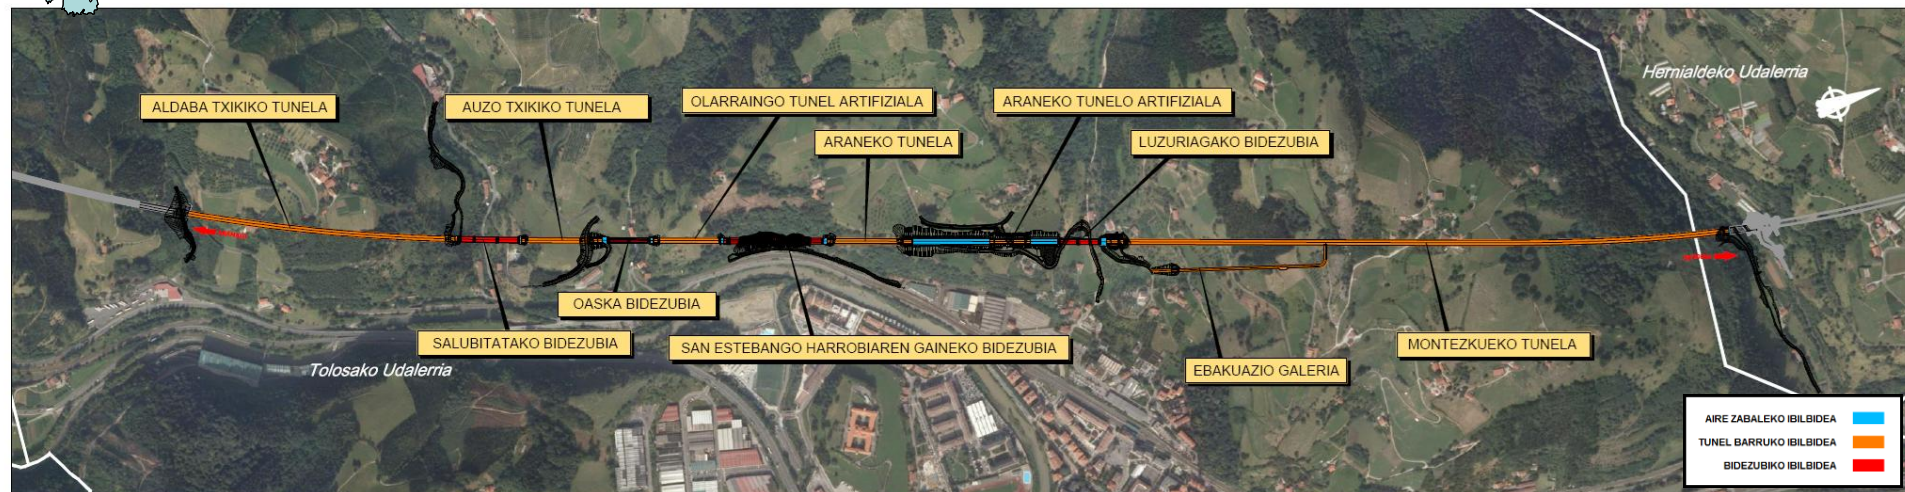**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	112.479.065,22	104.729.257,63	124.170.401,31
Epea (hilab.)	31	26	48

Kop. Luzera Sekzio librea


Bidezubiak	4	566,3 m.	
Tunelak	5	2.975,17 m.	85 m ²
Ebakuazio galeriak	1	418,87 m.	35 m ²

Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	17-07-2009
Eraikuntza proiektua:	01-06-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	14-01-2010
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	31-07-2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	20-09-2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	20-10-2010
Esleipena:	29-11-2010
Kontratista: UTE ISOLUX - CORSÁN CORVIAM, SA - GEOTÚNEL, SL	

Ezaugarri teknikoak


Luzera guztira: 3.811,07 m.
(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa: 3.550 m.
Gehieneko malda: 15,00 %
Gehieneko abiadura: 250 Km/h
Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Hernalde - Zizurkil

Zati hau 2019-08-01ean jaso zen

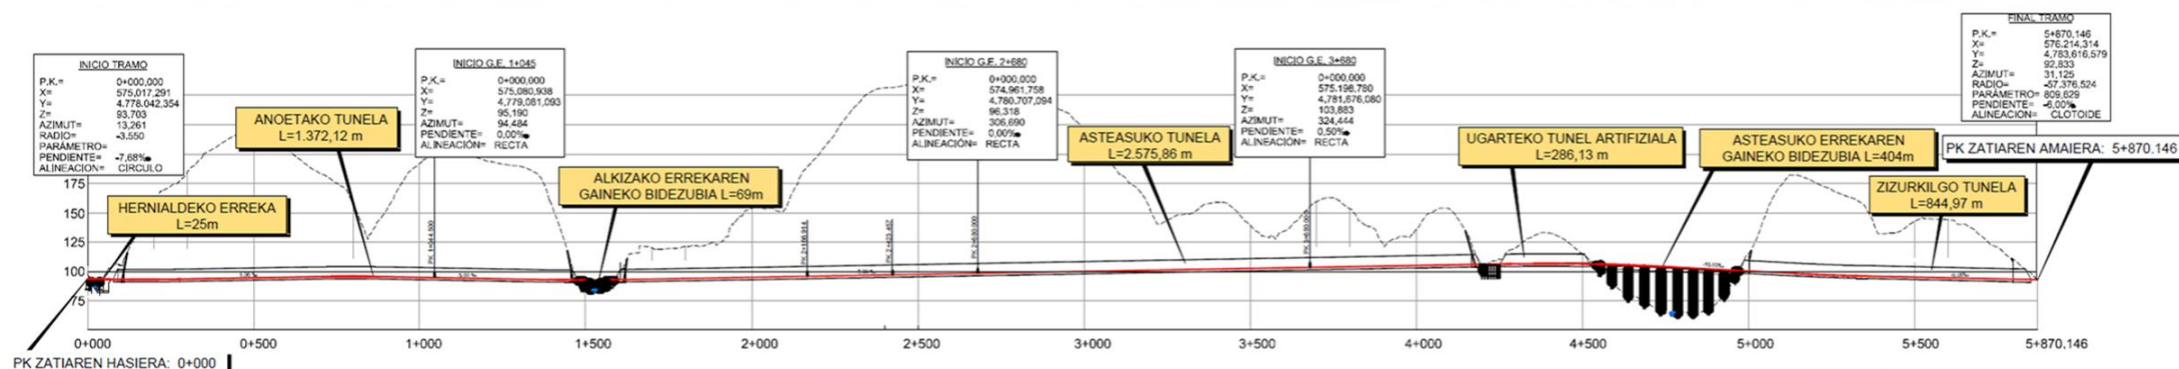**Kontratuen ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	169.011.341,7	158.042.505,62	155.251.110,78
Epea (hilab.)	42	42	82

*Indarreko aurrekontuan larrialdiko obra ere sartzen da

	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	3	498,00 m.	
Tunelak	4	5.061,08 m.	85-95 m²
Ebakuazio galeriak	3	1.556,79 m.	12,80 m²


Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa: 22-10-2000
 Azterlan informatiboa: 24-11-2000
 Oinarrizko proiektua: 30-07-2010
 Eraikuntza proiektua: 18-11-2011
 Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On: 01-12-2011
 Lizitazioaren iragarkia BOEn: 23-01-2012
 Eskaintza teknikoa zabaltzea: 12-03-2012
 Eskaintza ekonomikoa zabaltzea: 17-04-2012
 Esleipena: 20-06-2012

Kontratista: UTE ALTUNA Y URÍA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS - CYCASA
 CANTERAS Y CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIONES MURIAS

Ezaugarri teknikoak


Luzera guztira: 5.870,15 m.
 (Trenbide bikoitza)
 Gutxieneko erradioa: 3.600 m.
 Gehieneko malda: 15,00 ‰
 Gehieneko abiadura: 250 Km/h
 Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
 Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Zizurkil - Andoain

Zati hau 2019-08-01ean jaso zen

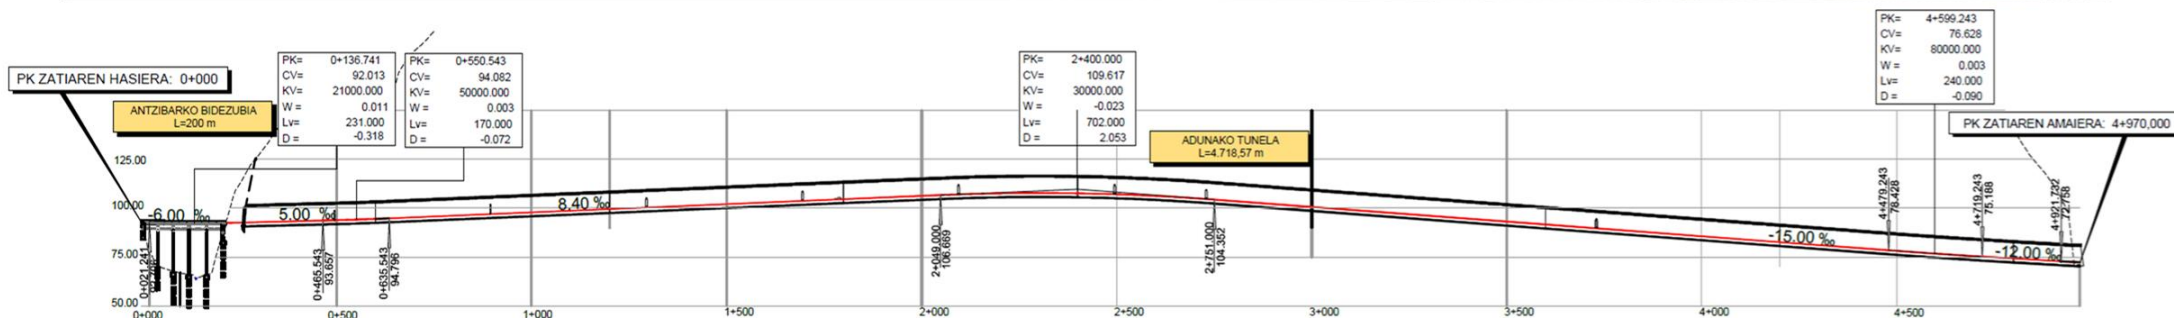**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	193.575.606,18	180.025.313,75	186.833.177,99
Epea (hilab.)	46	46	85

Bidezubiak

Kop. **Luzera** **Sekzio librea**

Tunelak	1	222,50 m.	85 m ²
Ebakuazio galeriak	2	3.638,00 m.	18,25 m ²


Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	13-04-2009
Azterlan informatiboa:	26-06-2009
Oinarrizko proiektua:	18-01-2010
Eraikuntza proiektua:	29-07-2011
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	28-07-2011
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	08-09-2011
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	02-11-2011
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	30-11-2011
Esleipena:	05-03-2012

Kontratista: DRAGADOS - AMENABAR - COMSA - LEZA - ISOLUX CORSAN CORVIAM

Ezaugarri teknikoak


Luzera guztira: 4.970 m.
(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa: 2.925 m.
Gehieneko malda: 15,00 ‰
Gehieneko abiadura: 250 Km/h
Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Andoain - Urnieta

Zati hau 2016-06-30ean jaso zen

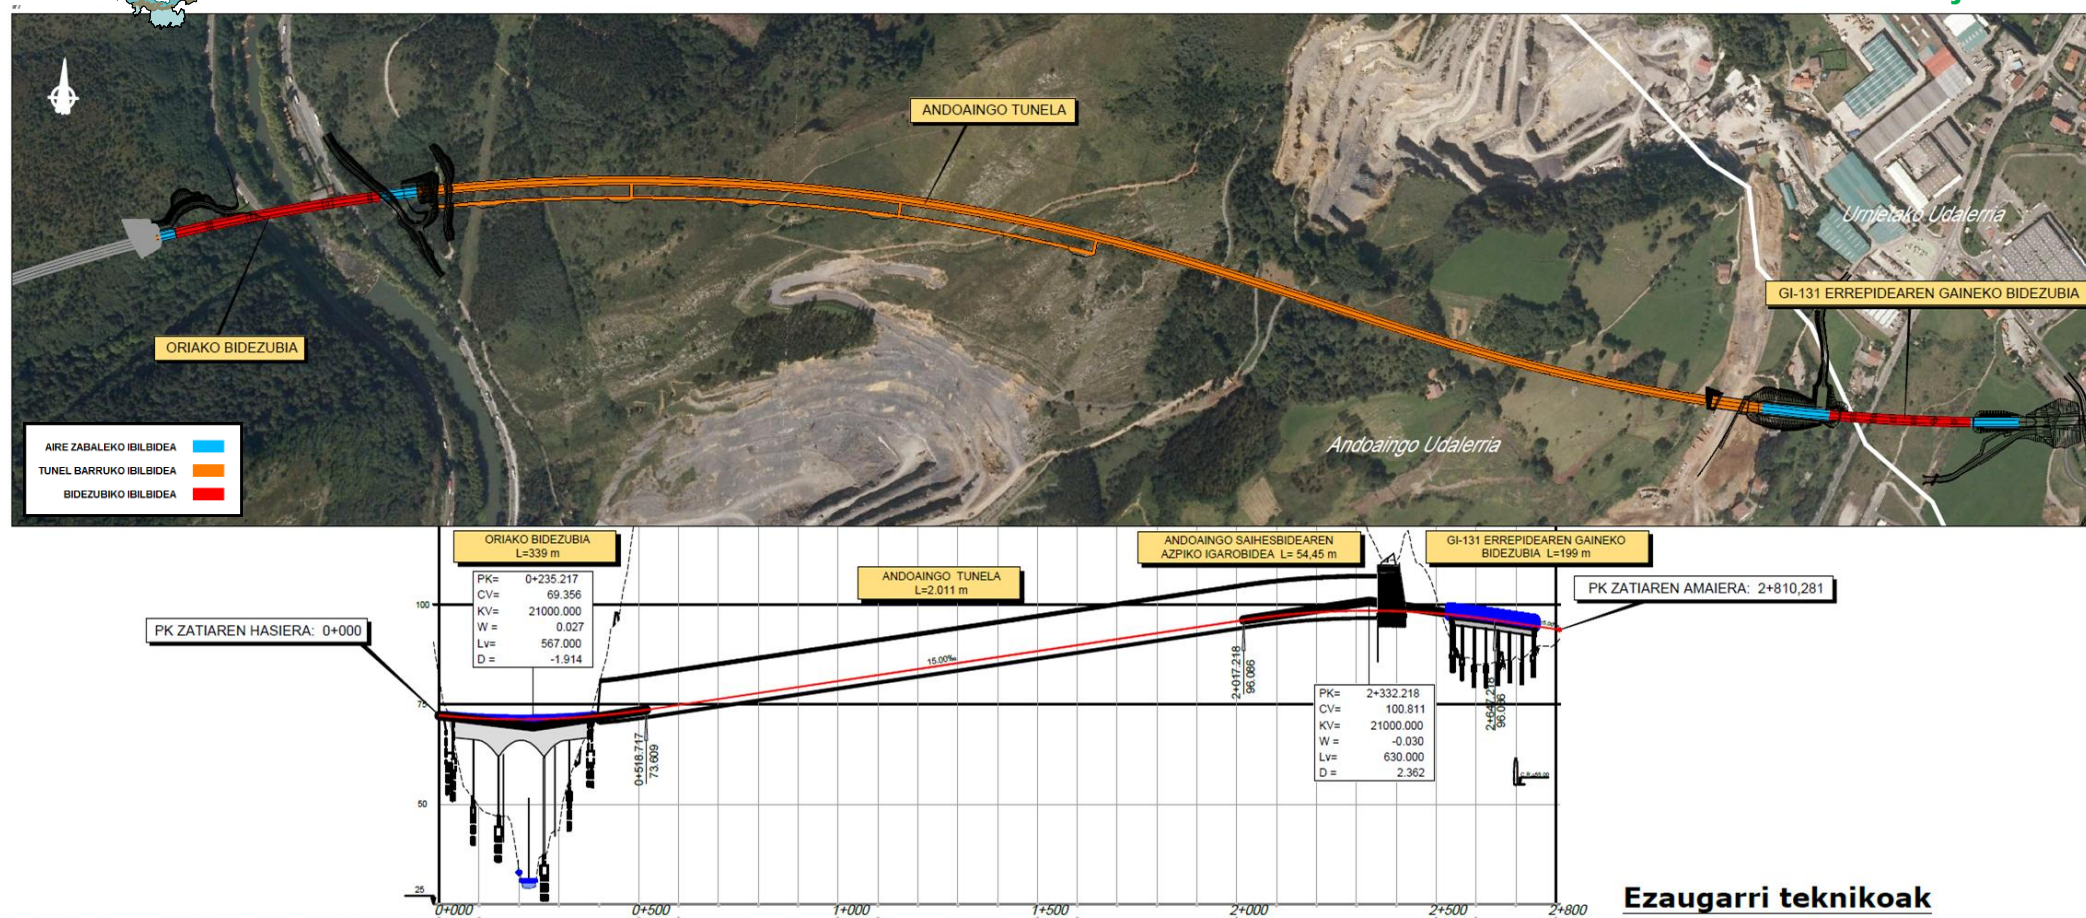

Kontratuaren ezaugarriak

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	80.074.757,78	75.670.646,10	88.108.748,75
Epea (hilab.)	34	34	64


	Kop.	Luzera	Sekzio librea
Bidezubiak	2	538 m.	
Tunelak	1	2011,00 m.	85 m²
Ebakuazio galeriak	1	996,00 m.	18,25 m²

Proiektuaren egoera

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	13-04-2009
Azterlan informatiboa:	26-06-2009
Oinarrizko proiektua:	18-01-2010
Eraikuntza proiektua:	23-06-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	14-01-2010
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	04/09/2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	22/10/2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	05/11/2010
Esleipena:	24/12/2010
Kontratista:	UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CONSTRUCCIONES AMENABAR, SA

Ezaugarri teknikoak



Luzera guztira:	2.810,28 m.
	(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	2.850 m.
Gehieneko malda:	15,00 ‰
Gehieneko abiadura:	240 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Urnieta - Hernani

Zati hau 2019-09-19an jaso zen

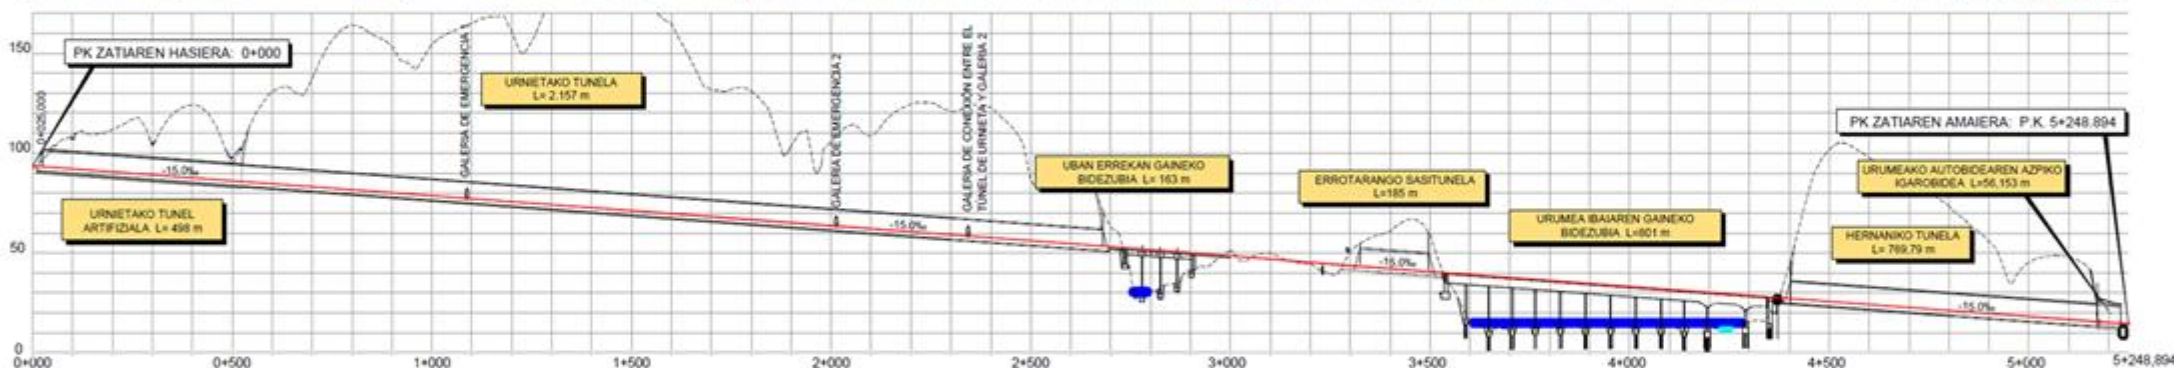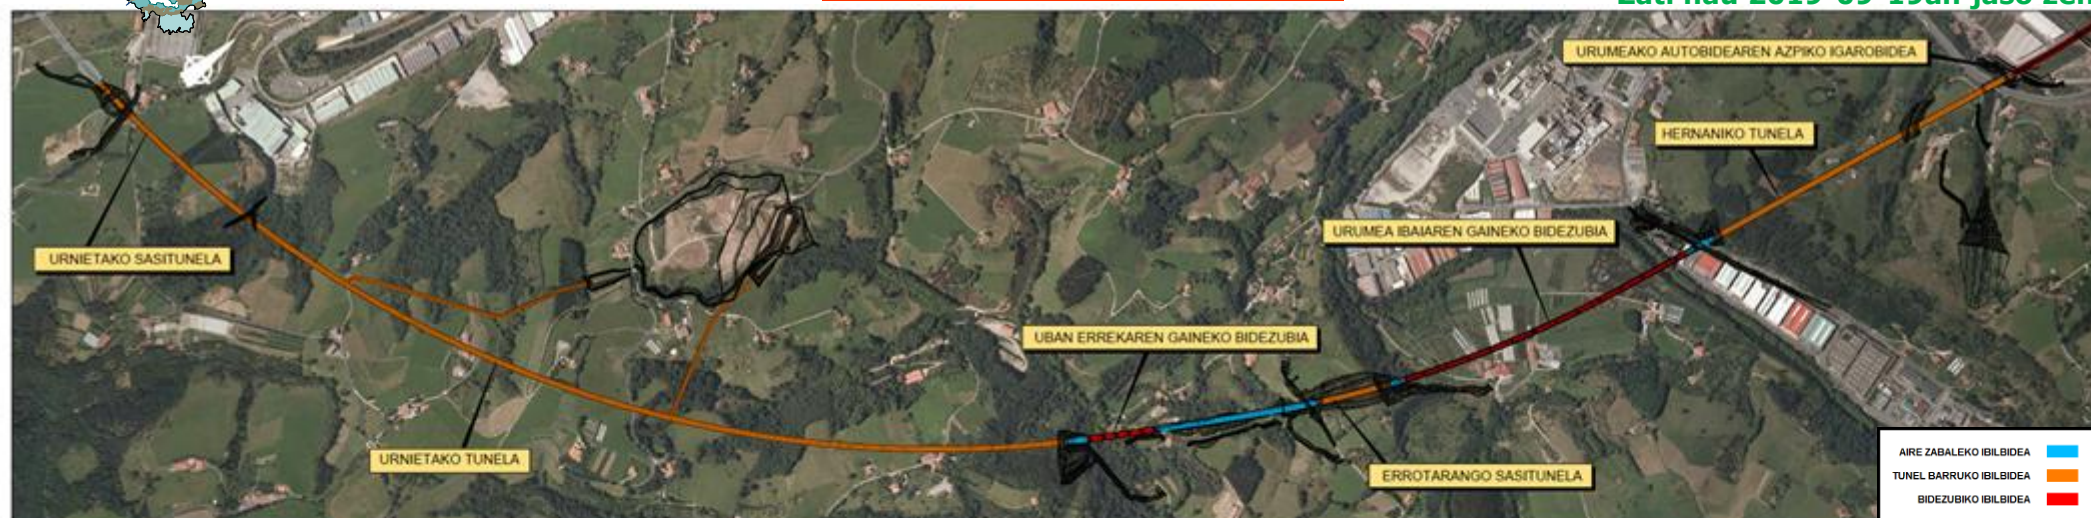

Kontratuaren ezaugarriak

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	144.972.210,28	136.346.363,77	132.476.912,93
Epea (hilab.)	35	33	103

Kop. Luzera Sekzio librea


Bidezubiak	2	964,00 m.	
Tunelak	4	3609,79 m.	85-95 m ²
Ebakuazio galeriak	1	1080,30 m.	30,2 m ²

Proiektuaren egoera



Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarrizko proiektua:	13-05-2010
Eraikuntza proiektua:	25-06-2010
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	14-01-2010
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	04/09/2010
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	20/10/2010
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	05/11/2010
Esleipena:	22/12/2010
UTE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, SA - CONSTRUCCIONES	
Kontratista: CIVILES LEZA, SA - COMSA SAU - OBRAS SUBTERRANEAS, SA	

Ezaugarri teknikoak

Luzera guztira: 5.248,89 m.
(Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa: 2.850 m.
Gehieneko malda: 15,00 ‰
Gehieneko abiadura: 240 Km/h
Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

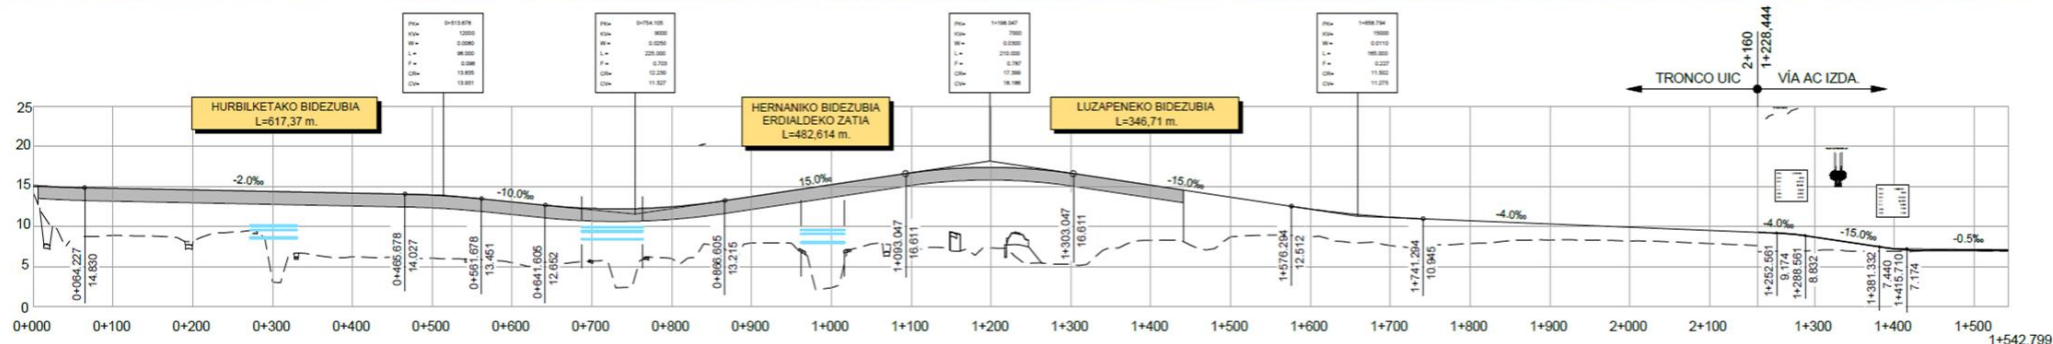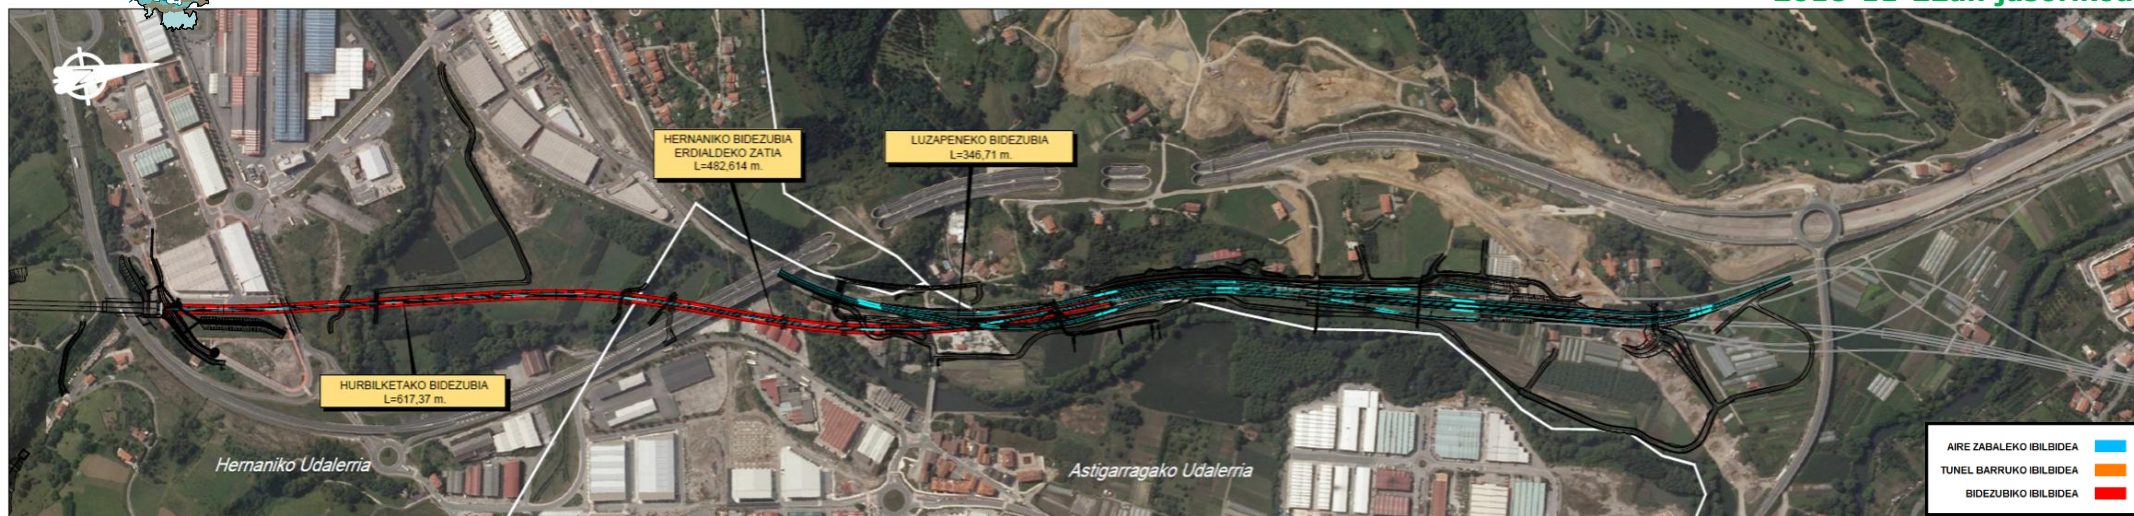Hernani – Astigarraga (I. Fasea)Era partzialean eginiko obra
2018-11-22an jasorikoa**Kontratuaren ezaugarriak**

	Lizitazioa	Esleipena	Indarrekoa
Aurrekontua (€)	76.495.366,09	71.523.167,3	35.679.775,13
Epea (hilab.)	28	27	66

* Indarreko aurrekontuan obra osagarria eta larrialdiko obra ere sartzen da


Kop. Luzera**Bidezubiak** 2 1.447,00 m.**Proiektuaren egoera**

Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa:	22-10-2000
Azterlan informatiboa:	24-11-2000
Oinarritzko proiektua:	22-07-2011
Eraikuntza proiektua:	29-07-2011
Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On:	28-07-2011
Lizitazioaren iragarkia BOEn:	08-09-2011
Eskaintza teknikoa zabaltzea:	03-11-2011
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea:	18-11-2011
Esleipena:	02-12-2011

Kontratista: MOYUA - BALZOLA - AZVI

Ezaugarri teknikoak


Luzera guztira:	2.475 m. (Trenbide bikoitza)
Gutxieneko erradioa:	700 m.
Gehieneko malda:	15,00 %
Gehieneko abiadura:	160 Km/h
Trenbide-zabalera:	Nazionartekoa (1.435 mm.)
Trafikoa:	Mistoa (bidaiariak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Ergobiako Oinezko Pasabidea (Hernani – Astigarraga)

2021-11-23an jaso zen

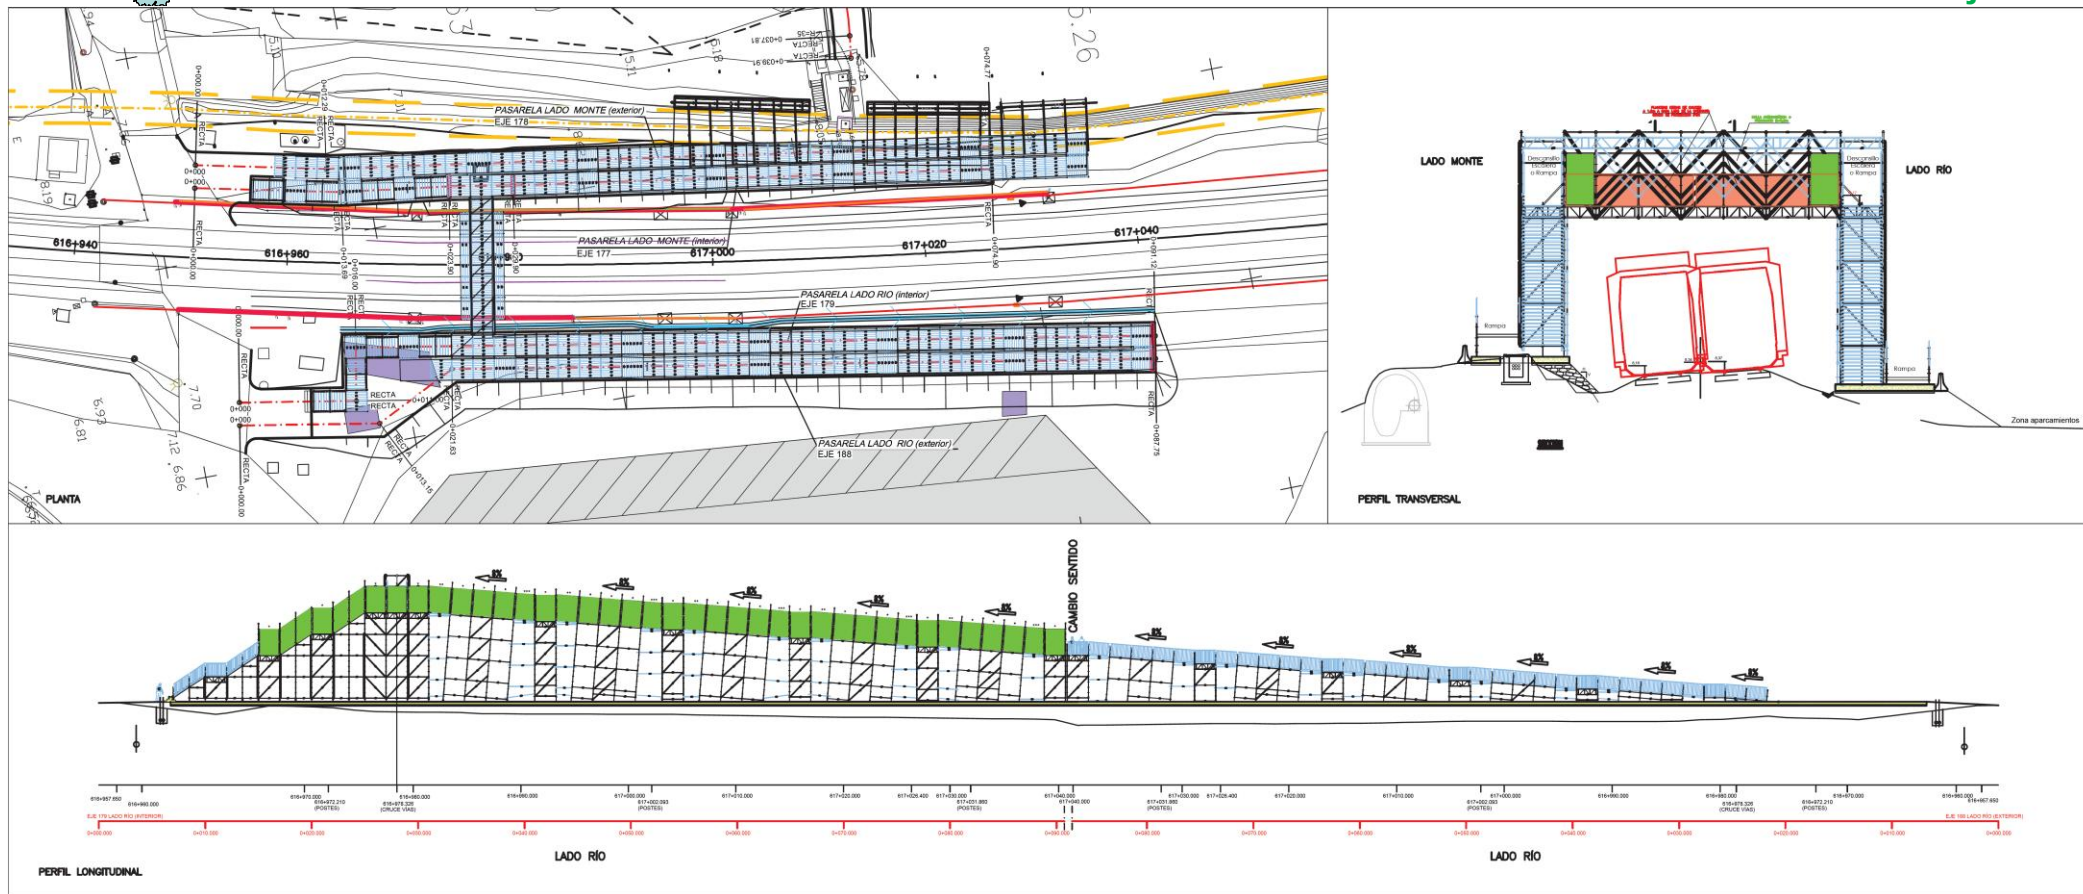**KONTRATUAREN EZAUGARRIAK**

KONTZERTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AUREKONTUA (€)	523.418,09	481.554,64	688.735,48 €
Epea (hilab.)	13	13	29

Madril-Irun lineako trenbide plataformaren gaineko behin behineko igarobidea, Ergobiako auzoan dagoen trenbide pasagunearen behin behineko egoera bideratzen duena, Astigarragako udalerrian, aipaturiko trenbide pasagunea berrezartzen duen Ergobiako Goiko Igarobidearen egikaritzea amaitu aurretik.


PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua: 2018/10/18
 Esleipena: 2019/01/10
 Kontratuaren sinadura data: 2019/02/02
 Zuinketa Aktaren data: 2019/02/08
 Amaierarako aurreikusten den data: 2021/07/15

Esleipenduna: **CONSTRUCCIONES MOYUA SL**

EZAUGARRI TEKNIKOAK

- **Igarobidea:**
 - Argia: 13 metro
 - Zabalera: 2 metro
 - Gutxieneko galiboa: 7 metro trenbide gainean.
- **Eskailerak:**
 - Altuera: 8 metro
 - Zabalera libre: 2 metro
- **Arrapalak:**
 - Garapena: 135 metro
 - Zabalera libre: 2 metro
 - %8ko malda



OBREN EGOERA

Ergobiako Gaineko Pasabidea (Hernani – Astigarraga)

Era partzialean eginiko obra
2020-04-24an jasorikoa

Zatiaren ikuspegi orokorra (fotomuntaketa).

KONTRATUAREN EZAUGARRIAK

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	5.833.310,93	5.480.987,00	6.806.894,55
Epea (hilab.)	11	11	11


* Indarreko aurrekontuan larrialdiko obra ere sartzen da

Proiektu honetan jasotzen diren planek, Ergobiako Bidearen Lehengoratzearen egikaritzea hartzen dute, batez ere, Astigarragako udalerriaren barruan. Horren nondik norakoak Madril-Irun trenbide lineako trenbidean dagoen igarobidea lehengoratzen du. Une honetan, haien arteko bide-gurutzea gaitzen du, Zubigain Pasealekua eta Okendotegi Bidea lotuz.

PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua:	2018/10/30
Esleipena:	2019/02/21
Kontratuaren sinadura data:	2019/03/22
Zuinketa Aktaren data:	2019/04/05
Amaierarako aurreikusten den data:	2020/03/12
Larrialdiko obra hasiera data:	15/04/2020
Larrialdiko obra jaso data:	17/12/2020


Esleipenduna: **CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A.**Larrialdiko Obra Esleipenduna: **SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.**



OBREN EGOERA

Ergobiako Gaineko Pasabidea Amaiera (Hernani – Astigarraga)

Zati hau 2021-07-13an jaso zen

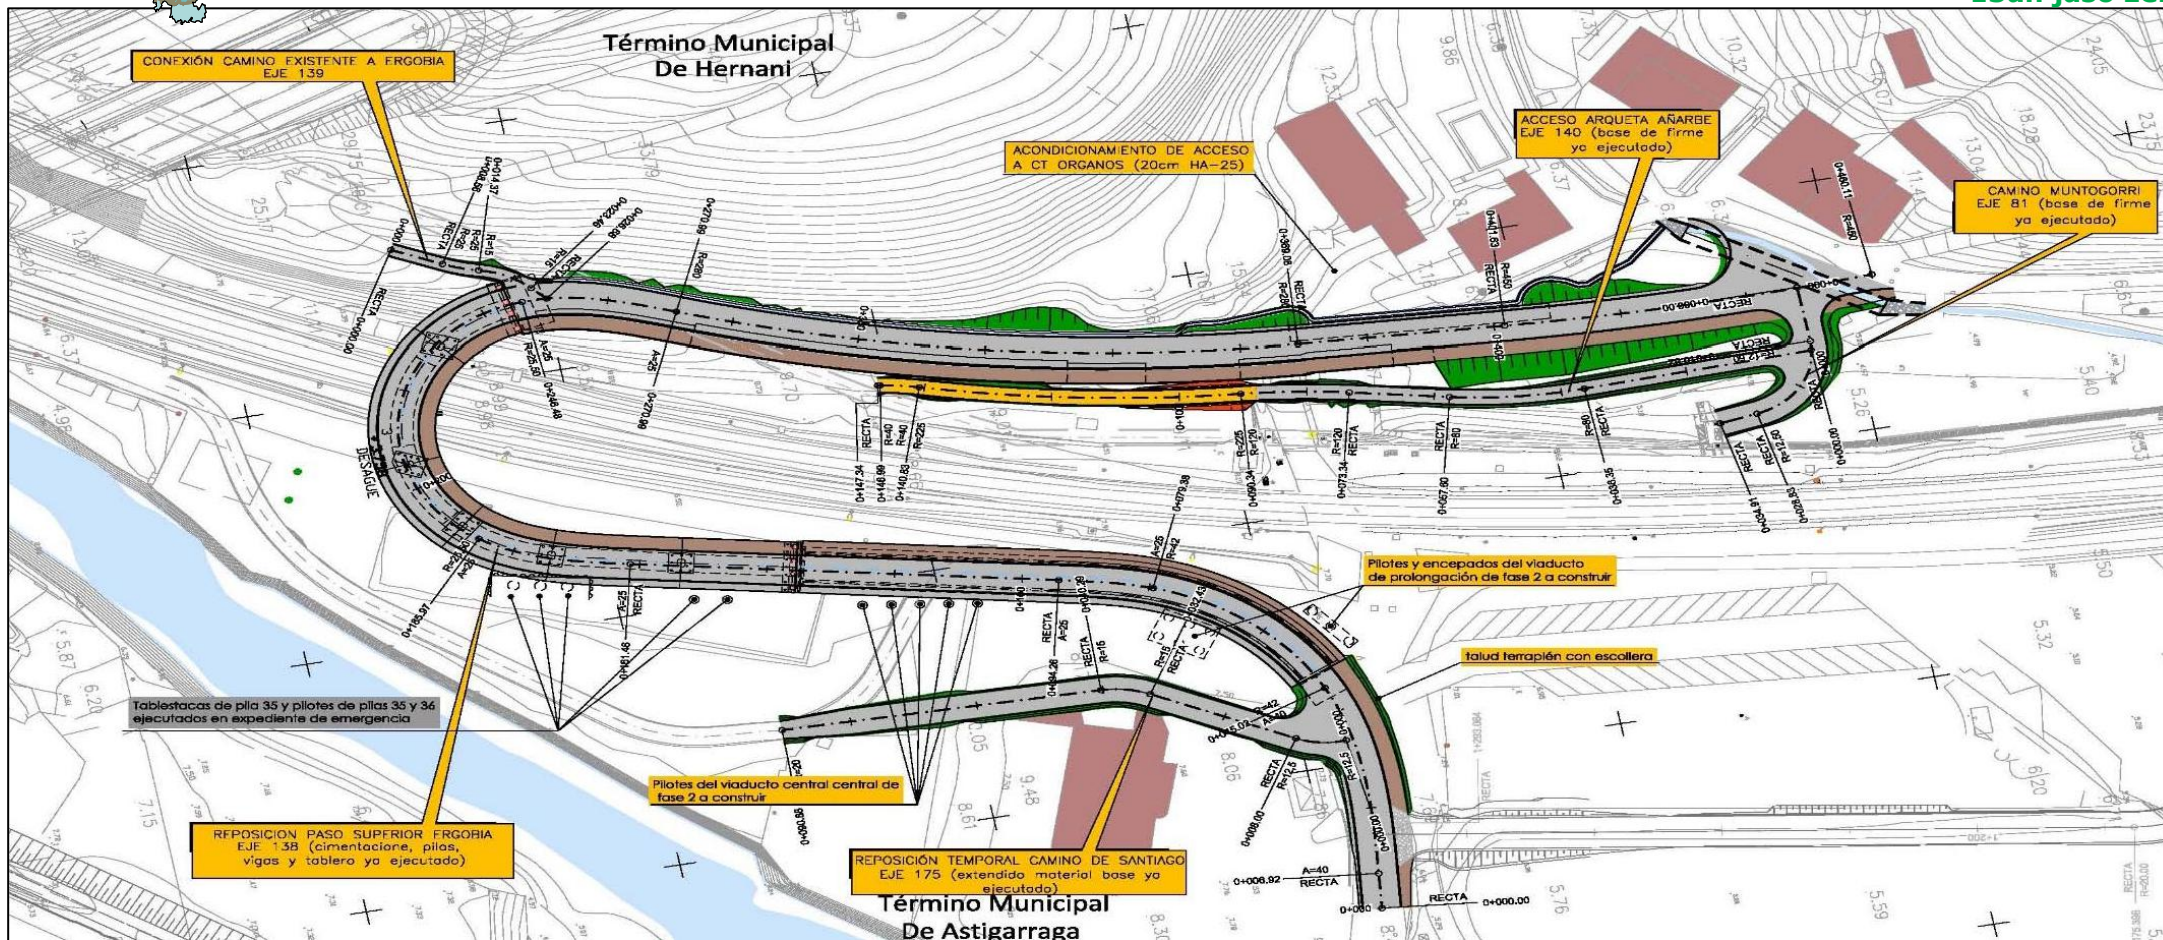


KONTRATUAREN EZAUGARRIAK

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	2.703.210,75	2.486.413,25	2.674.350,10
Epea (hilab.)	6	6	6

PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua: 21/09/2020
 Esleipena: 14/01/2021
 Kontratuaren sinadura data: 15/01/2021
 Zuinketa Aktaren data: 22/01/2021
 Amaierarako aurreikusten den data: 02/07/2021





Esleipenduna: **SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.**



OBREN EGOERA

Larrialdietako Irteera Berriak Tuneletan (Bergara – Astigarraga)

Zati hau
2024-02-1an
jaso zen

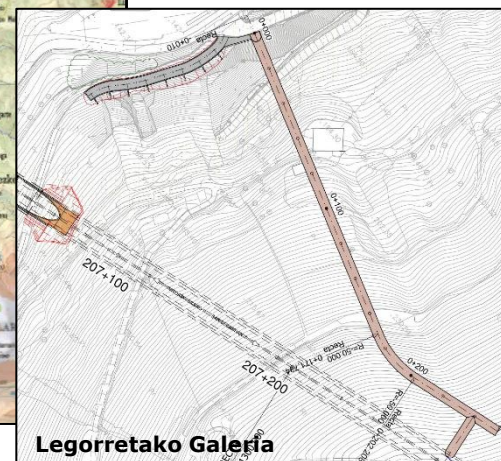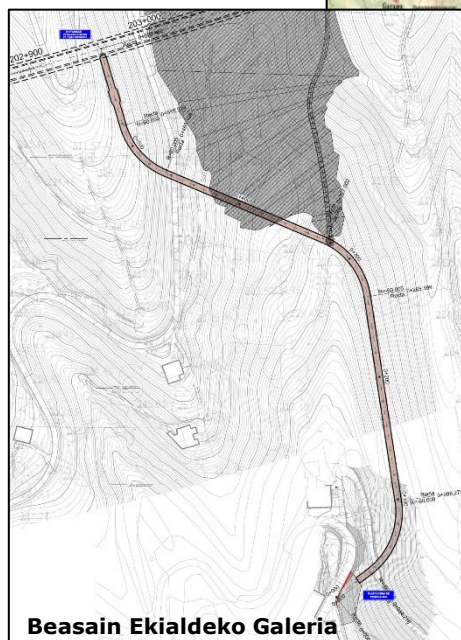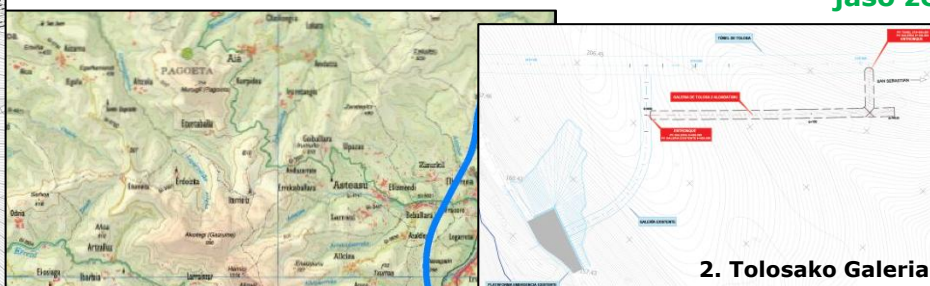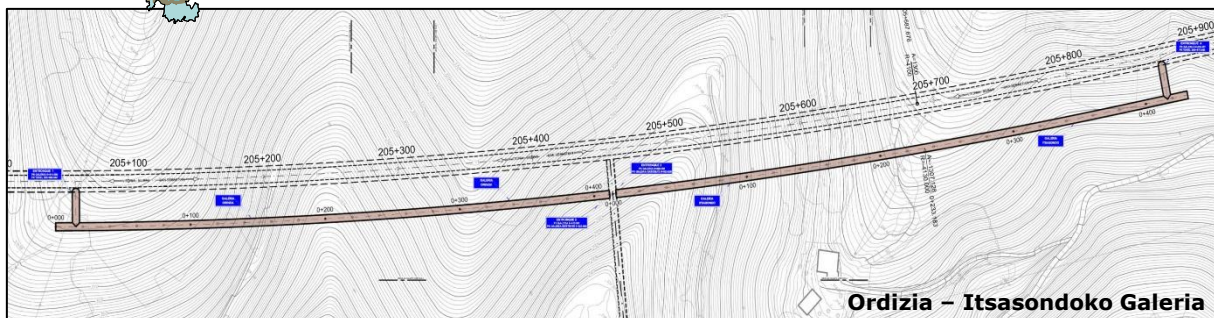

KONTRATUAREN EZAUGARRIAK

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	16.036.803,62 €	12.795.757,21 €	14.002.668 €
Epea (hilab.)	21	20	34 meses

PROIEKTUAREN EGOERA


Eraikuntza proiektua: 2018/10/24
Esleipena: 2019/06/06
Kontratuaren sinadura data: 2019/07/19
Zuinketa Aktaren data: 2019/08/19
Amaierarako data: 2023/11/30

Esleipenduna: **UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - OBRAS SUBTERRANEAS SA - CONSTRUCCIONES OLABARRI SL**

EZAUGARRI TEKNIKOAK


- **Beasain Ekialdeko Galeria:**
 - Luzera: 555 metro
- **Ordizia – Itsasondoko Galeria:**
 - Luzera: 411 metro eta 428 metro
- **Legorretako Galeria:**
 - Luzera: 255 metro
- **2. Tolosako Galeria:**
 - Luzera: 135 metro

Bergara- Astigarraga tartean egindako tunel batzuk une honetan indarrean dauden Interoperatibitatearen Zehaztasun Teknikoetara (IZT-ETI) egokitzeko xedea.



OBREN EGOERA

Plataforma Jarduera Gehigarriak (Bergara – Astigarraga) 2022-12-22an jaso zen

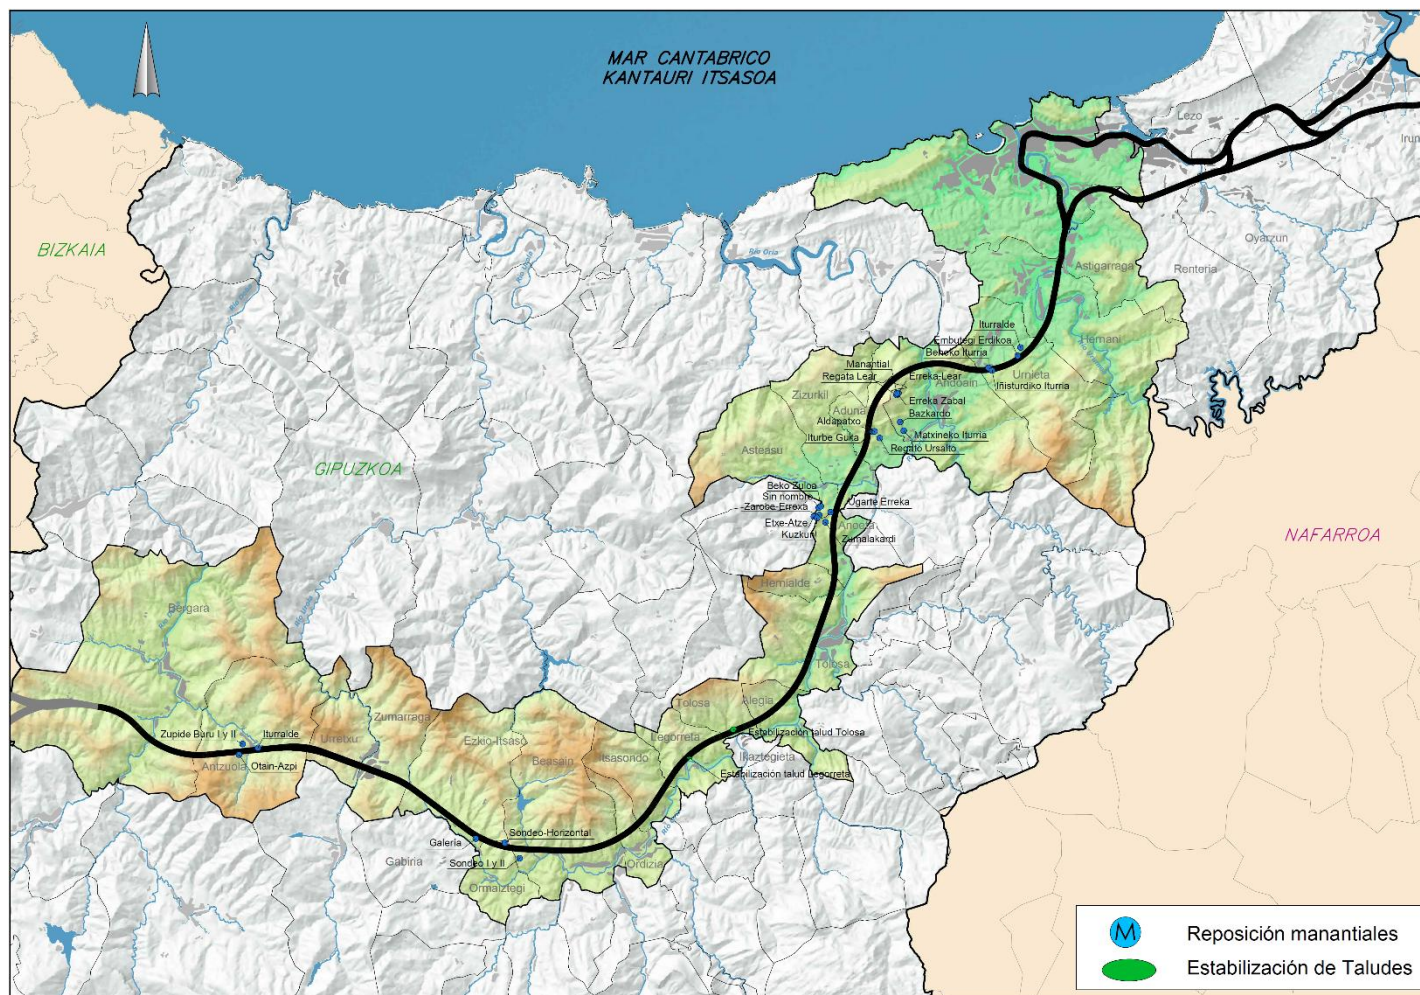**KONTRATUAREN EZAUGARRIAK**


KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	1.740.340,06 €	1.731.337,12 €	1.852.260,38 €
Epea (hilab.)	7,5	7,5	23

Proiektu hau, Bergara-Astigarraga tarteko lanek ukitutako iturburuen lehengoratzeari eta lanak amaitu ondoren ezegonkortasunak erakutsi dituzten ezponden egonkortzeari dagozkion lanak definitzeaz arduratzen da.

PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua: 2019/03/25
 Esleipena: 2019/07/05
 Kontratuaren sinadura data: 2019/08/27
 Zuinketa Aktaren data: 2019/09/27
 Amaierarako aurreikusten den data: 2022/10/31

Esleipenduna: **UTE CONSTRUCCIONES OLABARRI SL - TECSA**
EMPRESA CONSTRUCTORA SA




OBREN EGOERA

Hernani – Astigarraga (II. Fasea)

Tartea amaituta.

Jasotzeko zain

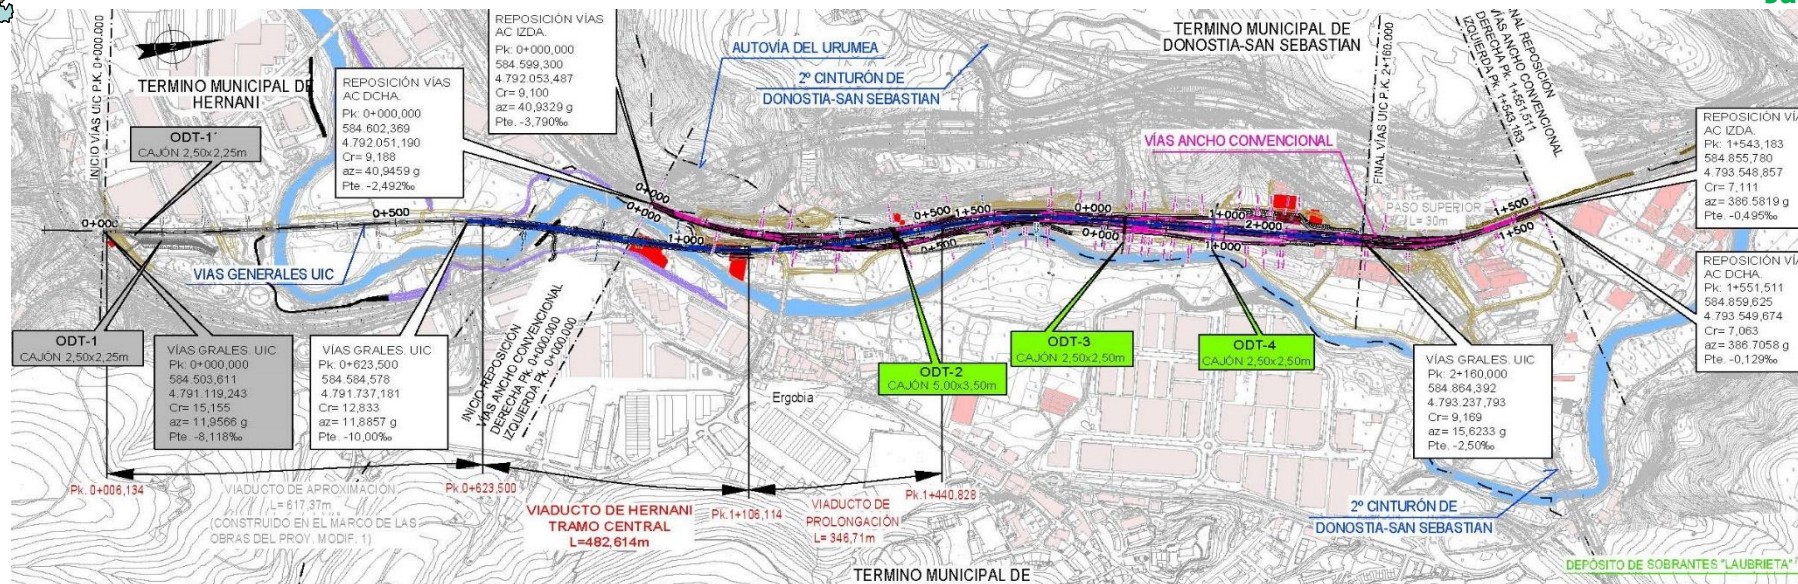

KONTRATUAREN EZAUGARRIAK

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	57.382.263,58	46.387.870,09	79.709.122,69
Epea (hilab.)	41	37	60


PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua: 30/10/2018
 Esleipena: 18/07/2019
 Kontratuaren sinadura data: 15/11/2019
 Zuinketa Aktaren data: 25/11/2019
 Aldatuta 1: 25/07/2021
 Aldatuta 2: 09/02/2023
 Amaierako aurreikusten den data: 03/09/2026

Esleipenduna: U.T.E. SACYR INF-SACYR NEOPUL-MARIEZCURRENA-ZUBIEDER

EZAUGARRI TEKNIKOAK

Luzera guztira 2.160 ml
 Gutxieneko erradioa: 700 m
 Gehieneko malda: 15,00 ‰
 Gehieneko abiadura: 160 km/h
 Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1,435 mm)
 Trafikoa: Mistoa (bidaia-irak+salgaiak)



OBREN EGOERA

Atotxako Geltokiaren zaharberritzea

2026-09-10ean jaso zen




KONTRATUAREN EZAUGARRIAK

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	97.062.445,24	80.416.235,87	113.874.447,23 €
Epea (hilab.)	42	42	73



PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua: 29/11/2019
 Esleipena: 02/04/2020
 Kontratuaren sinadura data: 22/06/2020
 Zuinketa Aktaren data: 06/07/2020
 Amaierarako aurreikusten den data: 30/08/2026

Esleipenduna: **UTE CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. / COMSA, S.A.U. / CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**



OBREN EGOERA

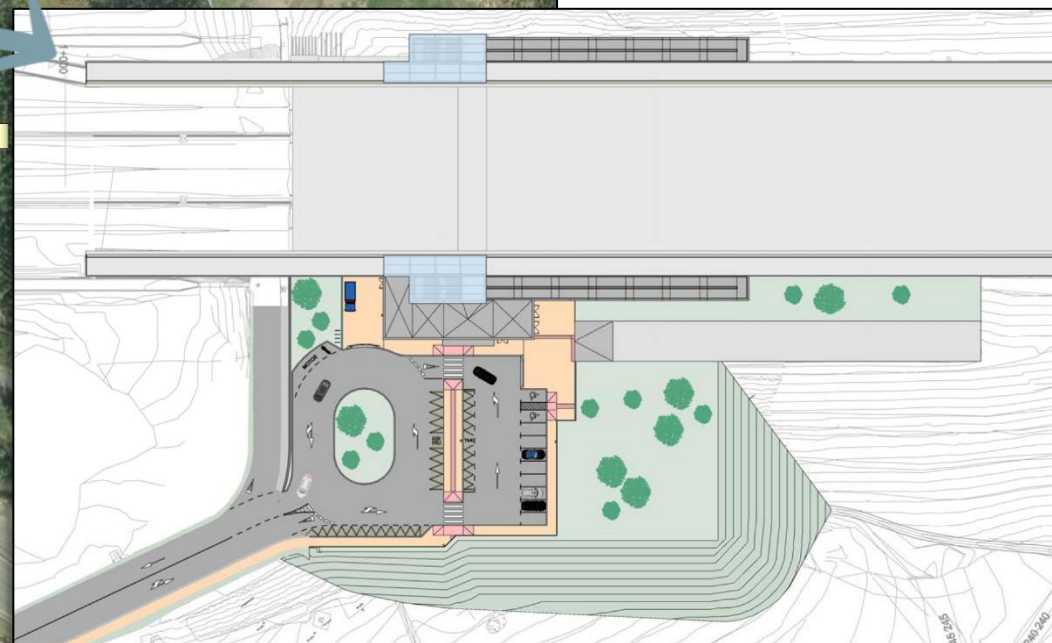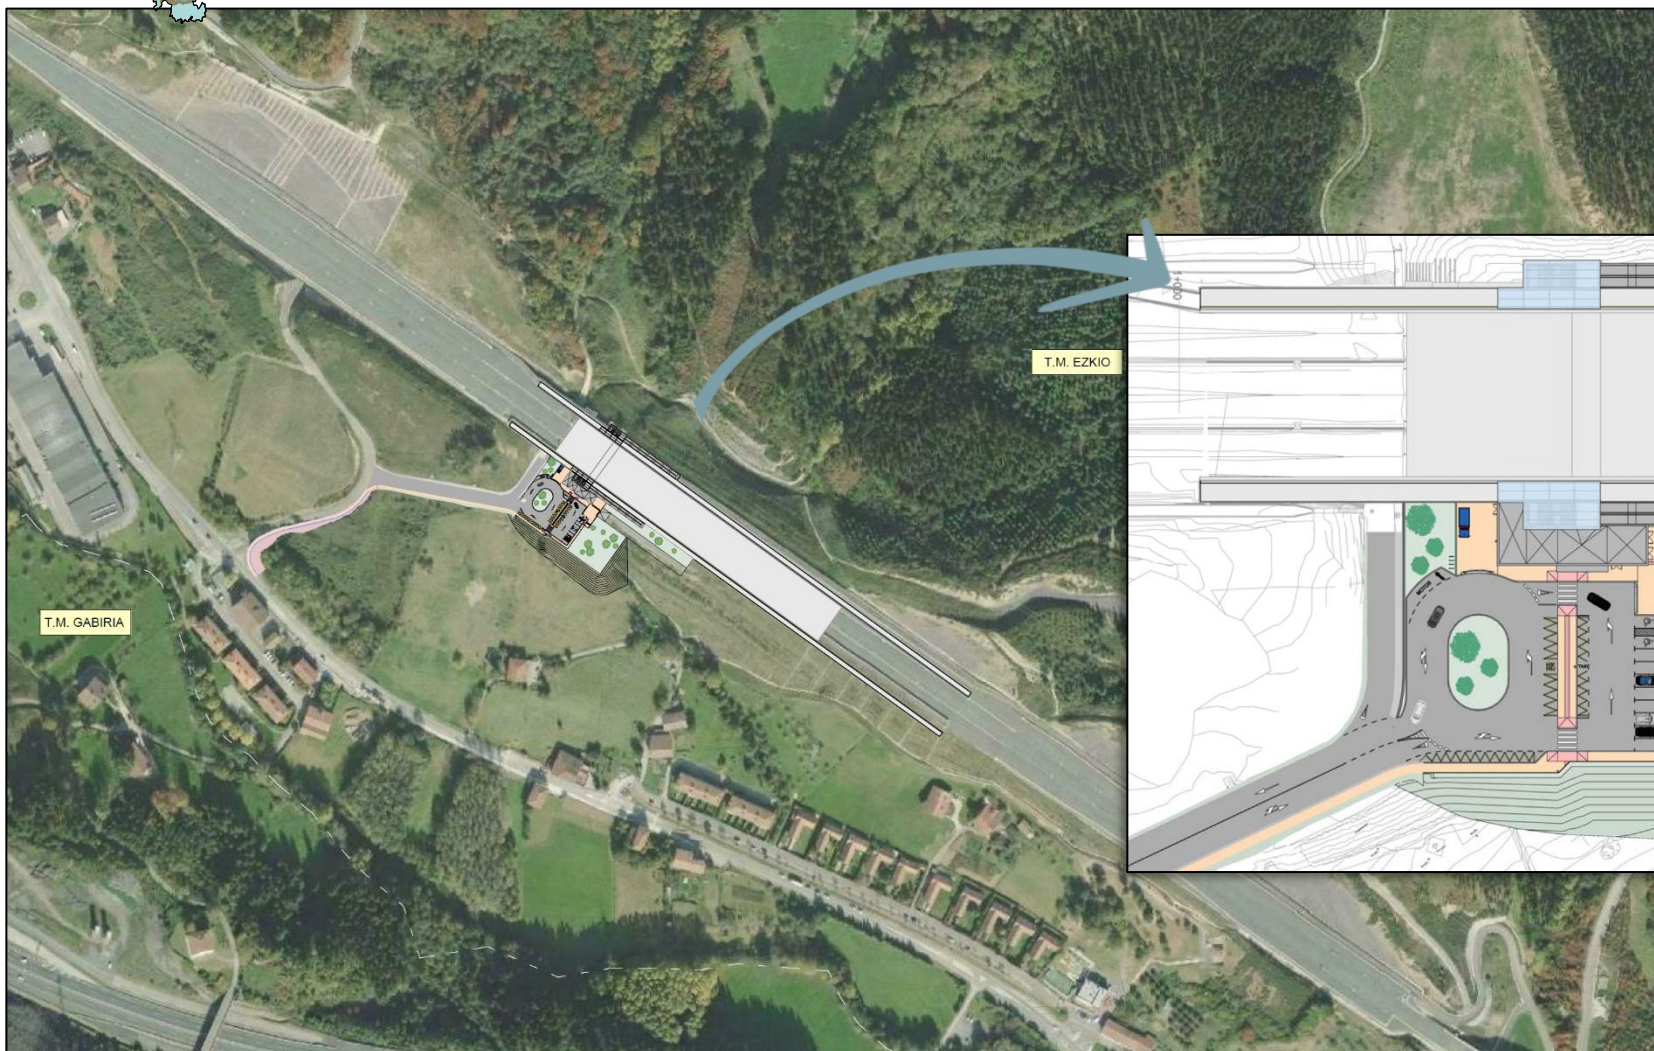
Ezkio/Itsasoko GeltokiaEra partzialen eginiko obra
2022-12-02an jasorikoa**KONTRATUAREN EZAUGARRIAK**

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	4.425.104,60	3.931.404,48	2.220.677,89
Epea (hilab.)	9	9	17

PROIEKTUAREN EGOERA


Eraikuntza proiektua: 26/02/2020
 Esleipena: 04/03/2021
 Kontratuaren sinadura data: 07/04/2021
 Zuinketa Aktaren data: 07/05/2021
 Amaierarako data: 27/09/2022

Esleipenduna: **IPARRAGIRRE ERAIKUNTZAK, S.L.**



OBREN EGOERA

Astigarragako aldiriko geltokia eta haren sarbideak

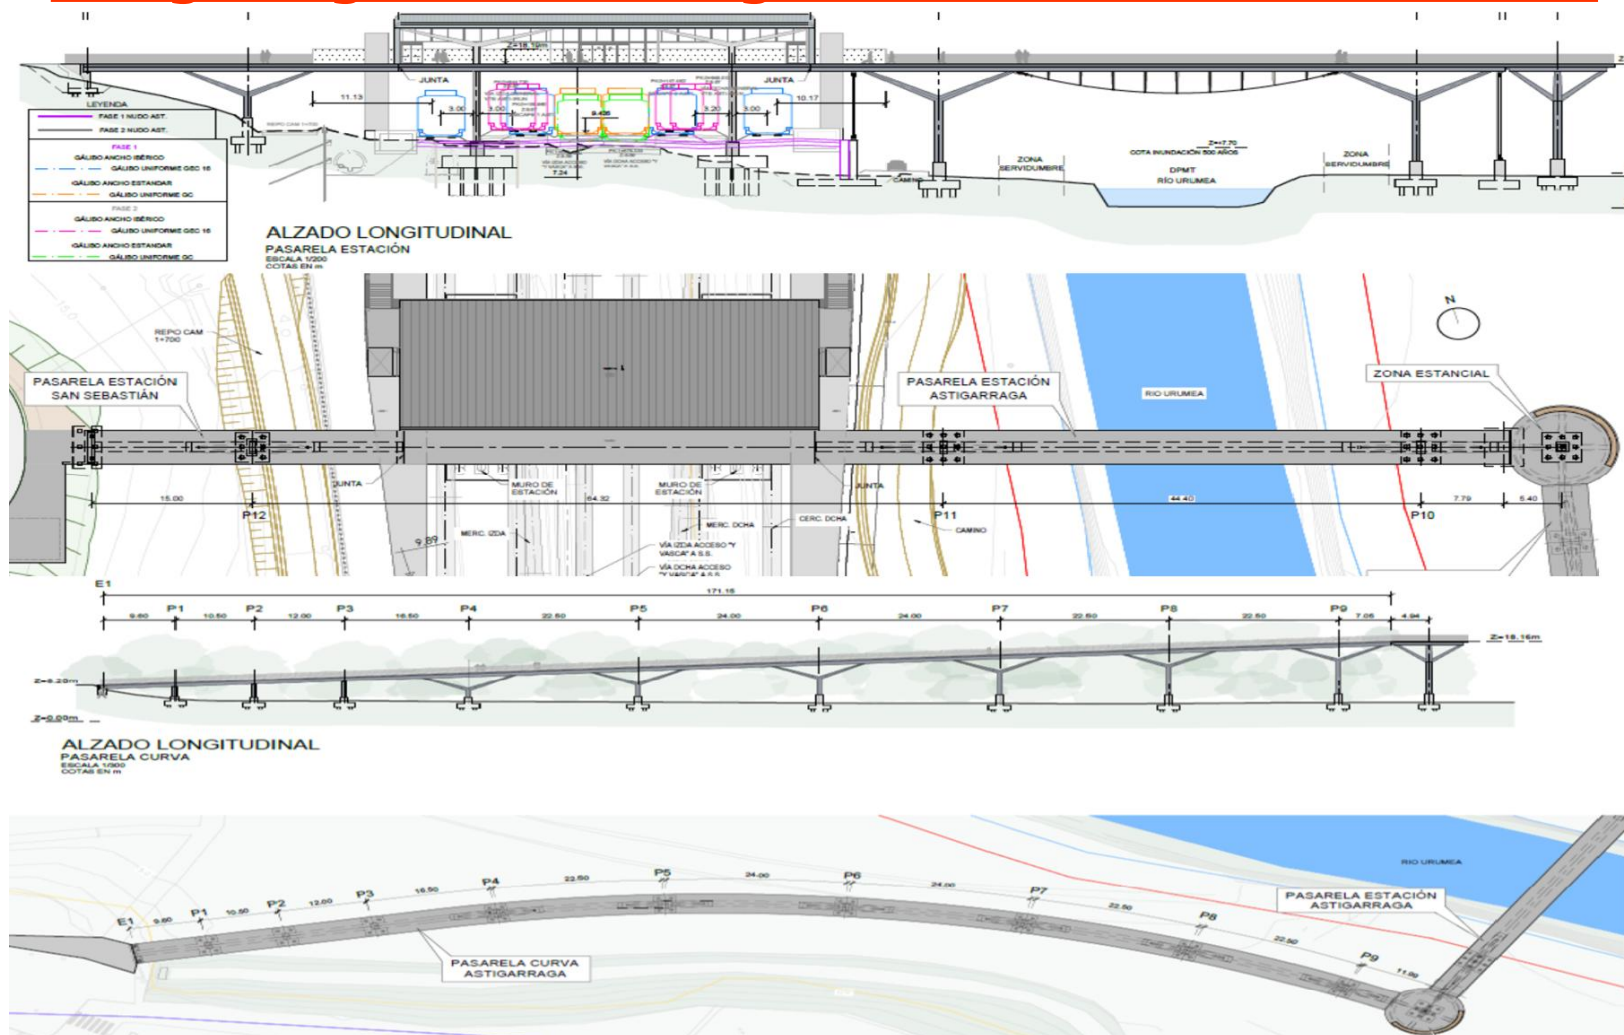


KONTRATUAREN EZAUGARRIAK

KONTZEPTU	LIZITAZIOA	ESLEIPENA	INDARREKOA
AURREKONTUA (€)	16.549.852,14 €	15.805.034,87 €	15.805.034,87 €
Epea (hilab.)	20	20	20

PROIEKTUAREN EGOERA

Eraikuntza proiektua: 27/12/2023
 Esleipena: 04/09/2025
 Kontratuaren sinadura data: 03/10/2025
 Zuinketa Aktaren data: 03/11/2025
 Amaierarako aurreikusten den data: 03/07/2027

Esleipenduna: **UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. - ALTUNA Y URÍA, S.A. - CONSTRUCCIONES MARIEZCURENA, S.L. - CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.**



OBREN EGOERA

Astigarragako aldiriko geltokia eta haren sarbideak

Obraren egoera

GELTOKIKO NASAK

- Zolatak, altxaerak eta nasa-losak amaituta.
- Nasen barruko erretilu metalikoen muntaketa amaituta.

GELTOKIA

- Nasetako hormak eginda (koroatze-habeak barne).
- Igogailuen egitura metalikoa muntatuta.
- Beheko eta goiko forjatuak eta Y formako habeak muntatuta.
- Egurrezko beheko forjatua muntatuta.

URBANIZAZIOA ETA DONOSTIA ALDEKO IBILGAILU-SARBIDEA

- Ibilgailu-sarbideko zoladurak egiten ari dira.
- ODT-1 eginda.
- Perimetroko horma egiten ari dira

PASABIDEA

- Pilen eta estriboen zimenduak amaituta.

ERAGINDAKO ZERBITZUEN BERREZARPENA

- Eragindako VTE-ABAS-ADS-01 hornidura-zerbitzua amaituta.
- Eragindako Telefónicaren TEL-TELEF-01 zerbitzua amaituta.
- Eragindako Iberdrolaren ELEC-IBE-01 zerbitzua amaituta
- Eragindako Iberdrolaren ELEC-IBE-02 zerbitzuaren kableatzea egiteko dago.

Irudi adierazgarriak



Geltokiko beheko forjatuaren muntaketa



Donostia aldeko ibilgailu-sarbidearen ikuspegia



Geltokiko egiturako Y formako pilen muntaketa
